INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO

Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Software II | Período 2-2026

SEGUNDO CORTE

Entrega del proyecto integrador

AgroValle Connect

Plataforma agrícola del Valle del Cauca

Grupo / célula	Grupo 1 — 6303B
Integrantes	Danny Alexander Gómez Michelle Guerrero Arboleda Starlin Gómez Asprilla Raúl Santiago Carrillo Hernández
Sprint	Sprint 2 | periodo de referencia: 19–29 de octubre de 2026

Resumen ejecutivo y evidencia técnica

Estado de evidencia: CI y JaCoCo corresponden al commit 6c19aae de main. Este PDF incorpora las pantallas y secuencias entregadas por el equipo; las fuentes también se incluyen en el paquete del repositorio.

Resumen ejecutivo del Sprint 2

Periodo de referencia: 19–29 de octubre de 2026. El inicio se reconstruyó desde el primer registro local fechado y el cierre fue indicado por el Product Owner; no son fechas de una ceremonia formal.

Objetivo reconstruido: alinear el incremento con los wireframes y mockups corregidos, y dejar documentados los flujos principales enviados por el equipo, la estrategia demostrativa de fletes, el modelo de datos, CI y Kanban, distinguiendo lo integrado de lo que falta validar.

Resultados y trabajo seleccionado

- **Interfaz y pruebas de navegador.** Se integraron los mockups corregidos del marketplace y se alineó el flujo E2E con los campos actuales. PR #52.
- **Diseño recibido.** El apéndice incluye los 7 wireframes, 7 mockups y 6 diagramas de secuencia que entregó el equipo.
- **Estrategia de fletes.** Se incorporó Strategy para tarifas demostrativas por municipio, seleccionadas por peso/destino; los valores no son tarifas comerciales validadas. PR #51.
- **UML técnico complementario.** Los exports de componentes, despliegue y secuencias PlantUML son diagramas técnicos derivados de sus fuentes; son distintos de las secuencias visuales que entregó el equipo.
- **Gestión del trabajo.** El tablero muestra issues reales, sin borradores: 3/3 en In Progress, 2/2 en Code Review / Testing y 14 en Done. GitHub Project.

Calidad técnica observada

- La ejecución GitHub Actions #83 terminó en verde para `main`, commit `6c19aae` (Java, Checkstyle, JaCoCo y E2E). El artefacto JaCoCo del mismo run informa 89% de instrucciones, 63% de ramas y 91% de líneas.
- La documentación de pruebas conserva evidencia del ciclo TDD Red–Green–Refactor y de pruebas unitarias/integración; la evidencia detallada de TDD corresponde a su propio cambio y no se atribuye automáticamente a cada archivo del incremento.

Aprendizajes, límites y cierre

Patrones y refactorización

La evidencia de código mapea SRP a la separación entre catálogo y gestión de productos; OCP y LSP a estrategias de flete intercambiables; ISP al contrato reducido de cálculo de flete; y DIP a la abstracción de cálculo de descuentos inyectada en reservas. Es un mapeo acotado a ejemplos concretos, no una afirmación de que todo el sistema cumpla cada principio de forma uniforme. Strategy se usa en fletes/descuentos y Observer en eventos de notificación.

Aprendizajes observables

- La interfaz debe distinguir lo que solo es visual de lo que la API realmente persiste o expone; por ejemplo, la vista previa de fotografía sigue siendo local y algunas consultas de historial no tienen soporte completo.
- Los snapshots Kanban permiten reportar conteos y WIP en fechas observadas, pero no calcular de forma fiable throughput, lead time, cycle time, CFD o Ley de Little sin eventos fechados completos.
- La revisión y la retrospectiva se registran como documentos asíncronos preparados por el Product Owner. El equipo confirmó que el resumen representa el trabajo y que no tiene comentarios adicionales; no se inventa una ceremonia ni consenso sobre cada propuesta.

Estado del incremento

- **Modelo de datos.** El issue #46 registra conservar el esquema actual y dejar los catálogos normalizados como mejora futura. El snapshot SQL resume Flyway V1–V6, que sigue siendo la fuente ejecutable. La revisión describe las dependencias que el DDL sí expresa y deja las reglas de dominio no codificadas como alcance por validar; no se propone una migración sin una decisión de dominio.
- **Calidad técnica.** Actions #83 terminó en verde para el código y las pruebas de `main` en `6c19aae`; el reporte JaCoCo del mismo commit muestra 89% de instrucciones, 63% de ramas y 91% de líneas. La evidencia está incluida en estas páginas.
- **Paquete documental.** Esta copia reúne resumen, evidencias CI/JaCoCo y las 20 láminas de diseño recibidas. Las fuentes PNG/JPG también permanecen en el repositorio.

Enlaces: repositorio main | GitHub Project | PR #53 (roles del equipo)

Diseño y arquitectura

Esta sección organiza los artefactos gráficos de modelado y prototipado que entregó el equipo, según la guía del Sprint de Diseño y Arquitectura de AgroValle Connect.

Prototipos de interfaz

- 7 wireframes de baja fidelidad y 7 mockups de alta fidelidad: inicio, catálogo, detalle, registro, publicación, panel del agricultor y panel del administrador.


Diagramas de secuencia recibidos

- Registro de agricultor; inicio de sesión y publicación; reserva; contacto; despacho; y una referencia anterior del registro de producto.

Las imagenes se reproducen en las paginas siguientes y sus fuentes se conservan en docs/diseno/mockups/ y docs/diseno/secuencias/. Los UML generados desde PlantUML son artefactos técnicos complementarios, separados de estas láminas recibidas.

Wireframe - Inicio

Lámina fuente recibida del equipo

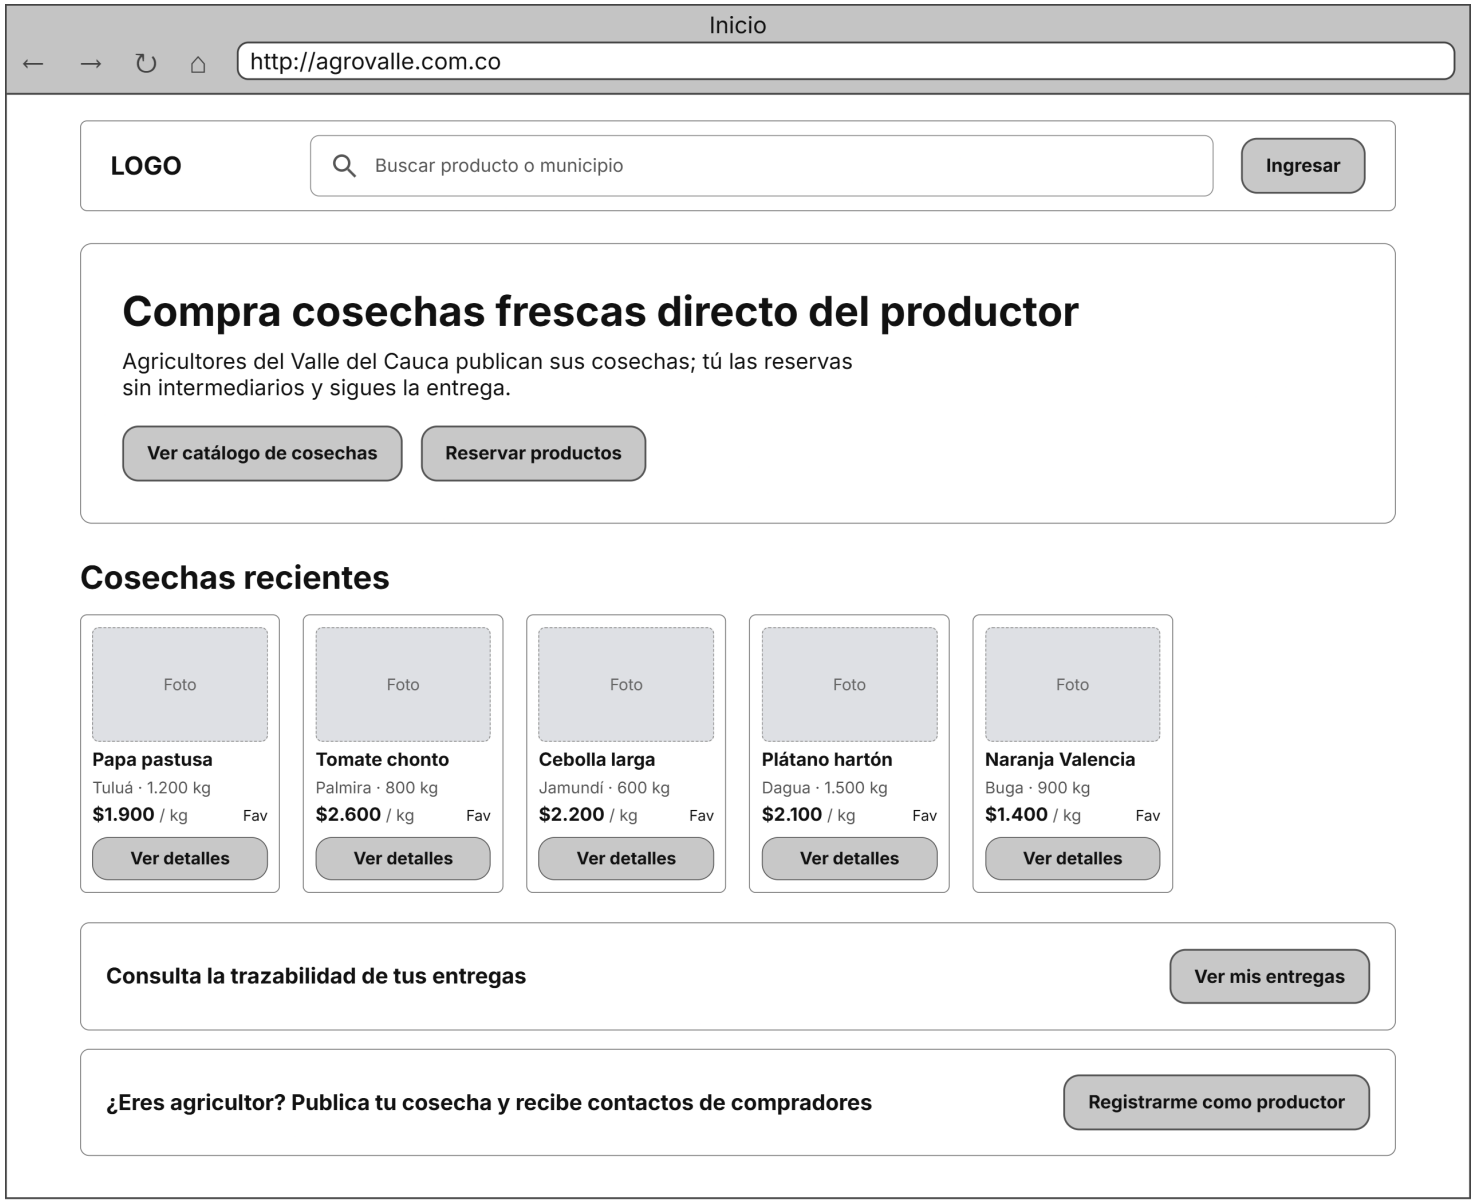

Wireframe - Catálogo

Lámina fuente recibida del equipo

Catálogo

← → ↻ ⌂ http://agrovalle.com.co

LOGO

Buscar producto o municipio

Ingresar

Filtros

Municipio

Todos los municipios

Productor o comerciante


Todos

Categoría

Todas las categorías

Aplicar filtros

Precio regional (ejemplo)



Historial de cambios

Cosechas recientes

Foto

Papa pastusa
Tuluá · 1.200 kg
$1.900 / kg Fav
Ver detalles

Foto

Tomate chonto
Palmira · 800 kg
$2.600 / kg Fav
Ver detalles

Foto

Cebolla larga
Jamundí · 600 kg
$2.200 / kg Fav
Ver detalles

Foto

Plátano hartón
Dagua · 1.500 kg
$2.100 / kg Fav
Ver detalles

Foto

Naranja Valencia
Buga · 900 kg
$1.400 / kg Fav
Ver detalles

Foto

Aguacate Hass
Sevilla · 450 kg
$6.800 / kg Fav
Ver detalles

Foto

Zanahoria
Tuluá · 950 kg
$1.500 / kg Fav
Ver detalles

Foto

Mora de Castilla
Dagua · 300 kg
$5.200 / kg Fav
Ver detalles

Foto


Limón Tahití
Jamundí · 700 kg
$1.800 / kg Fav
Ver detalles

Foto

Lulo
Sevilla · 250 kg
$4.900 / kg Fav
Ver detalles


Wireframe - Detalles

Lámina fuente recibida del equipo

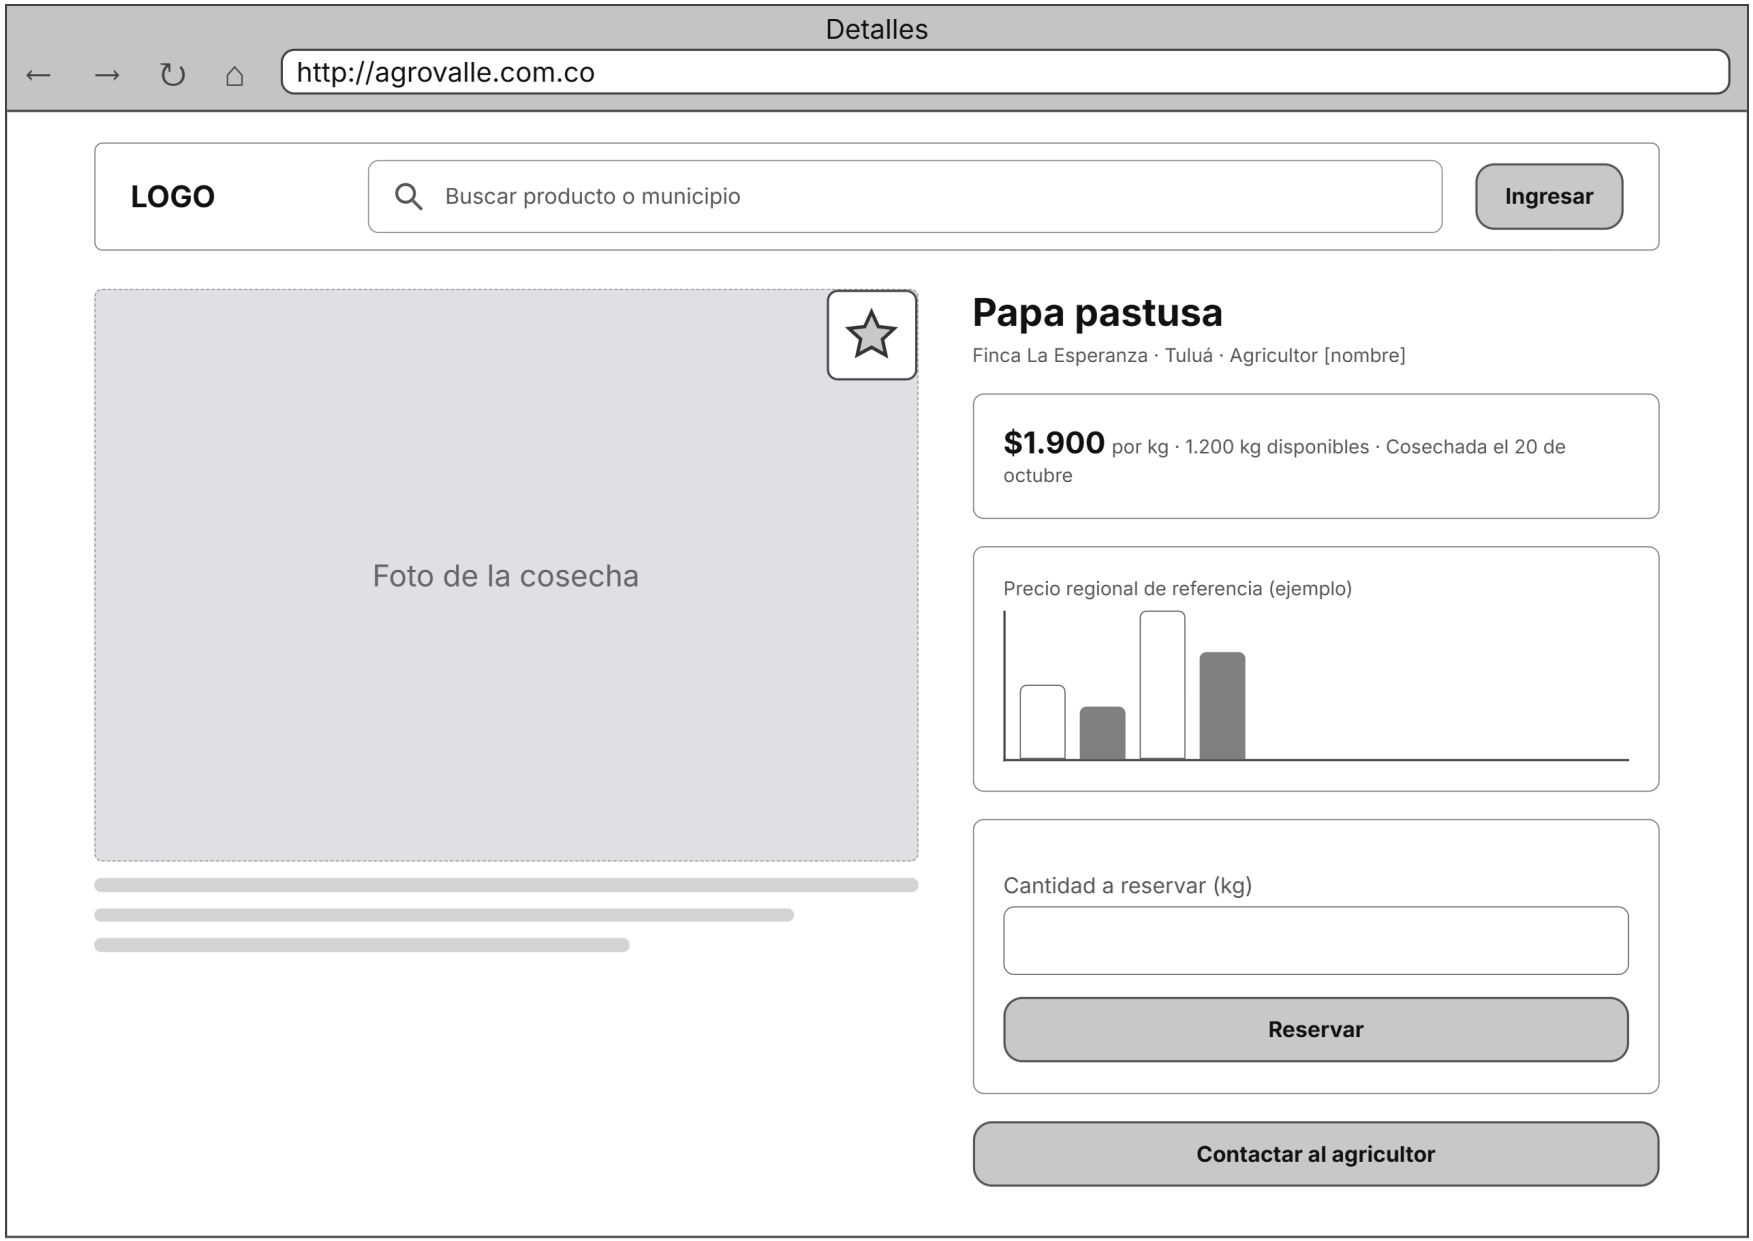


Wireframe - Registro

Lámina fuente recibida del equipo

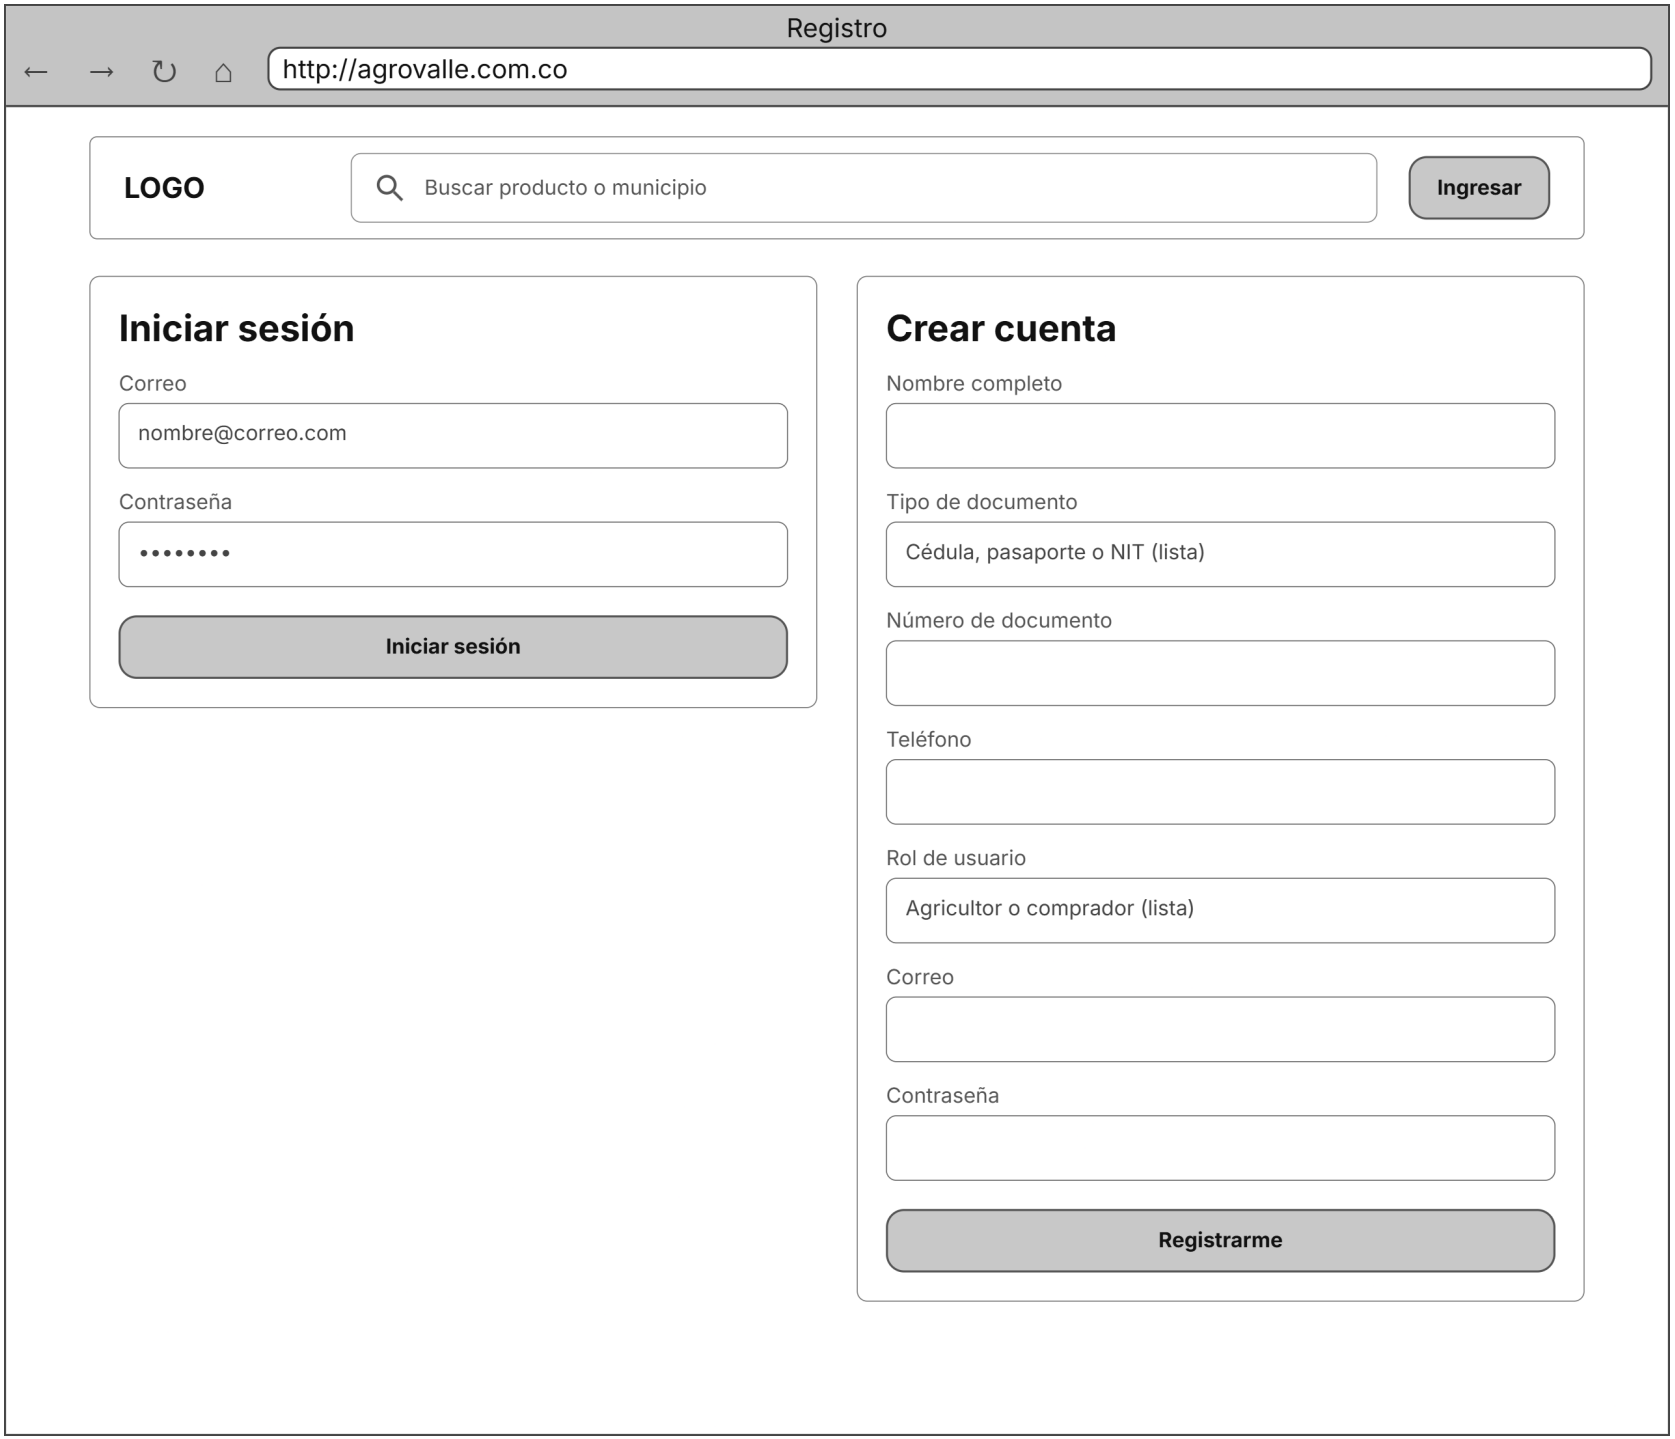


Wireframe - Publicar

Lámina fuente recibida del equipo

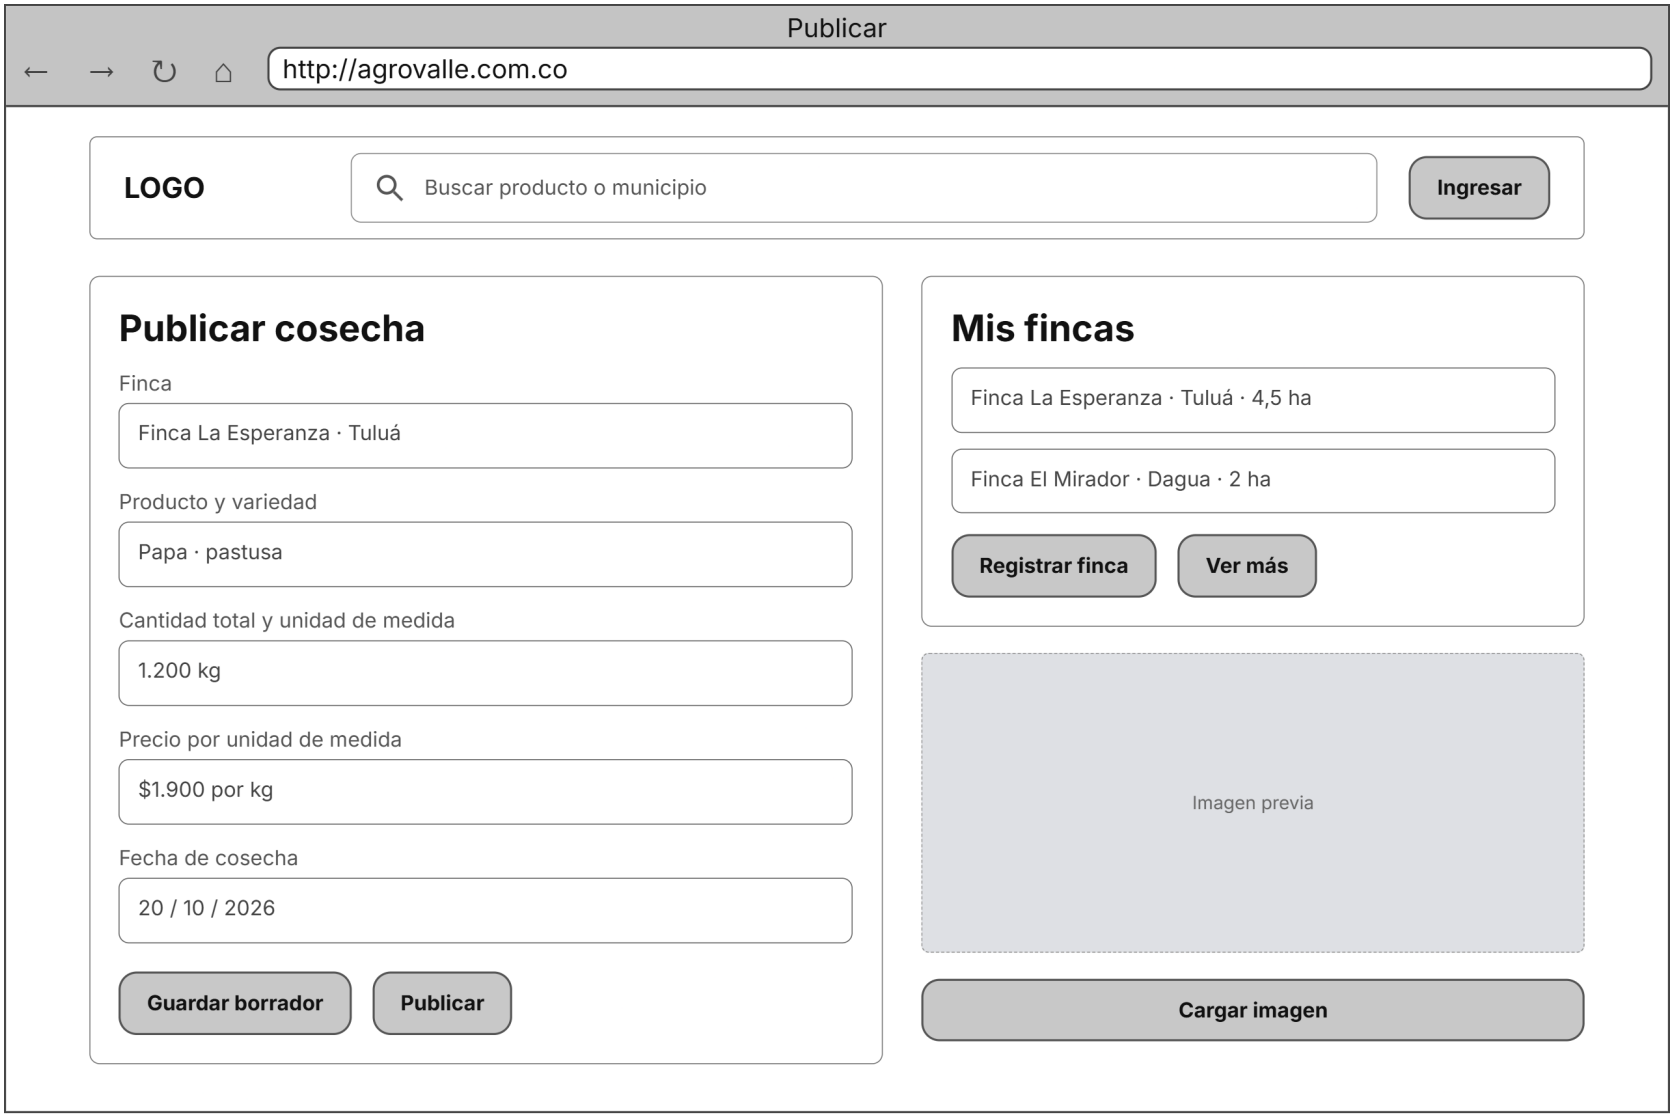


Wireframe - Panel agricultor

Lámina fuente recibida del equipo

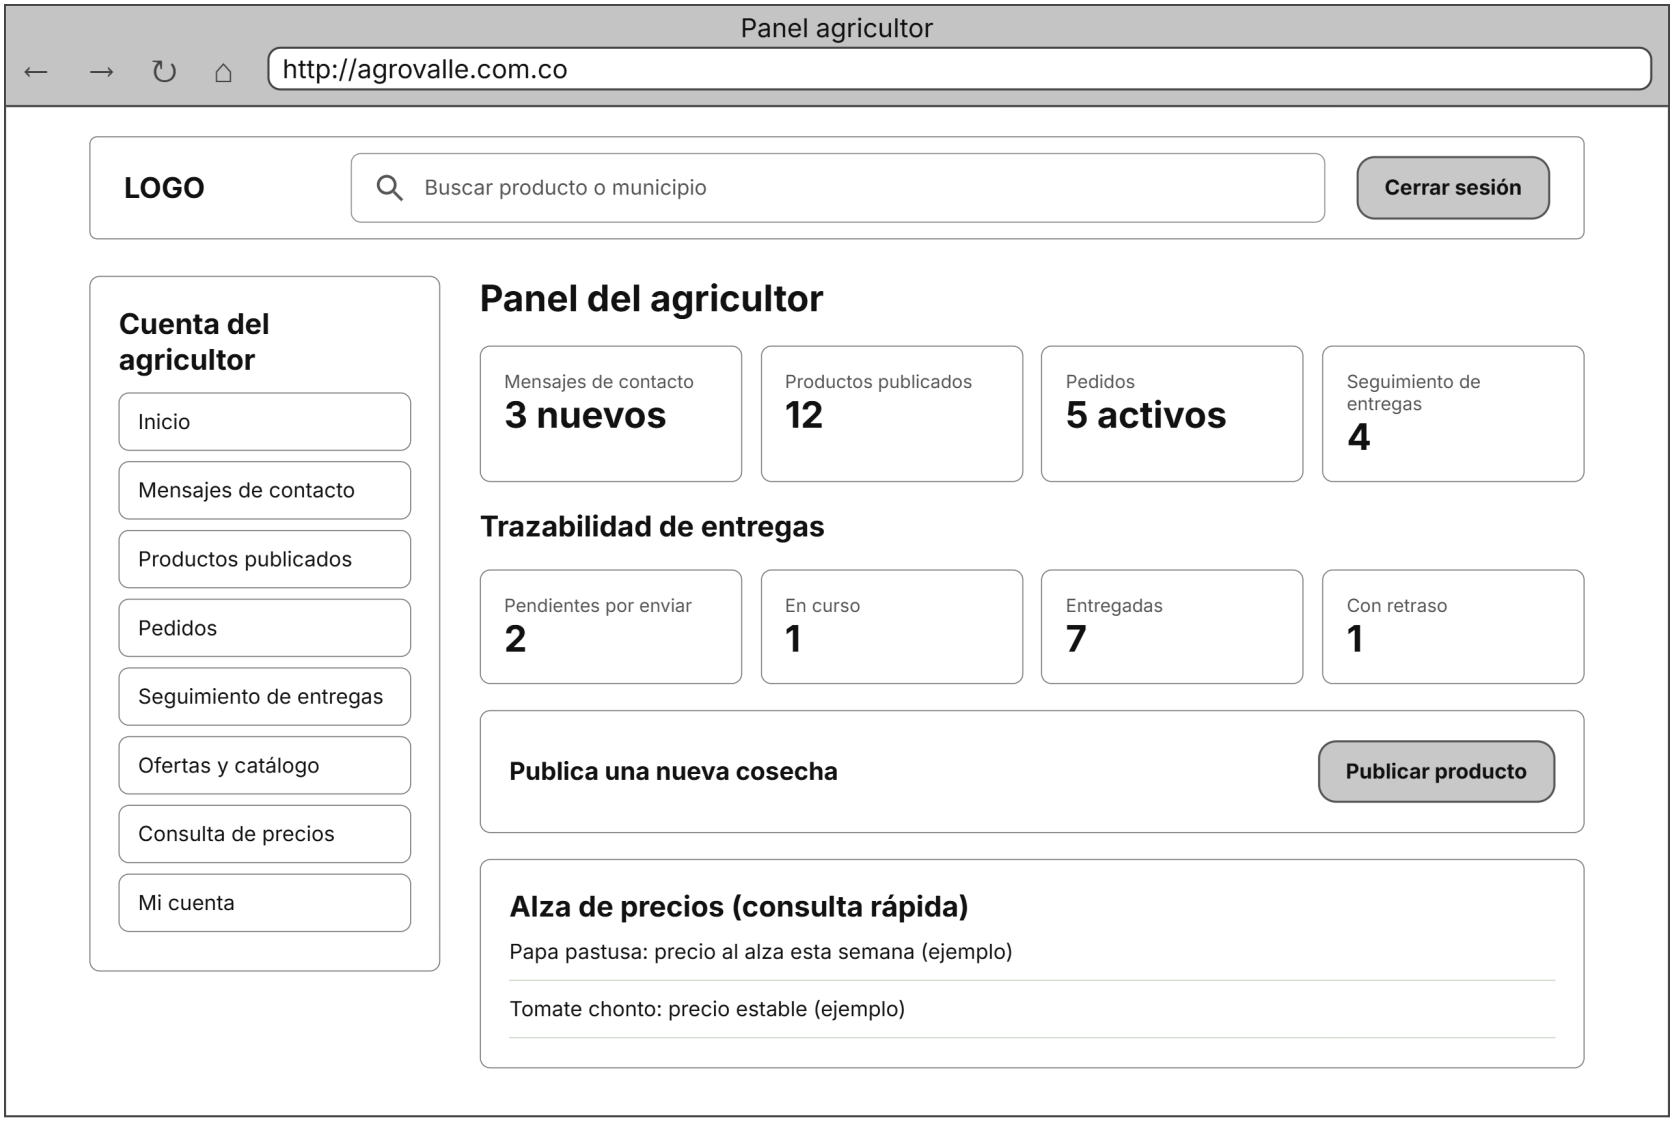


Wireframe - Panel administrador

Lámina fuente recibida del equipo

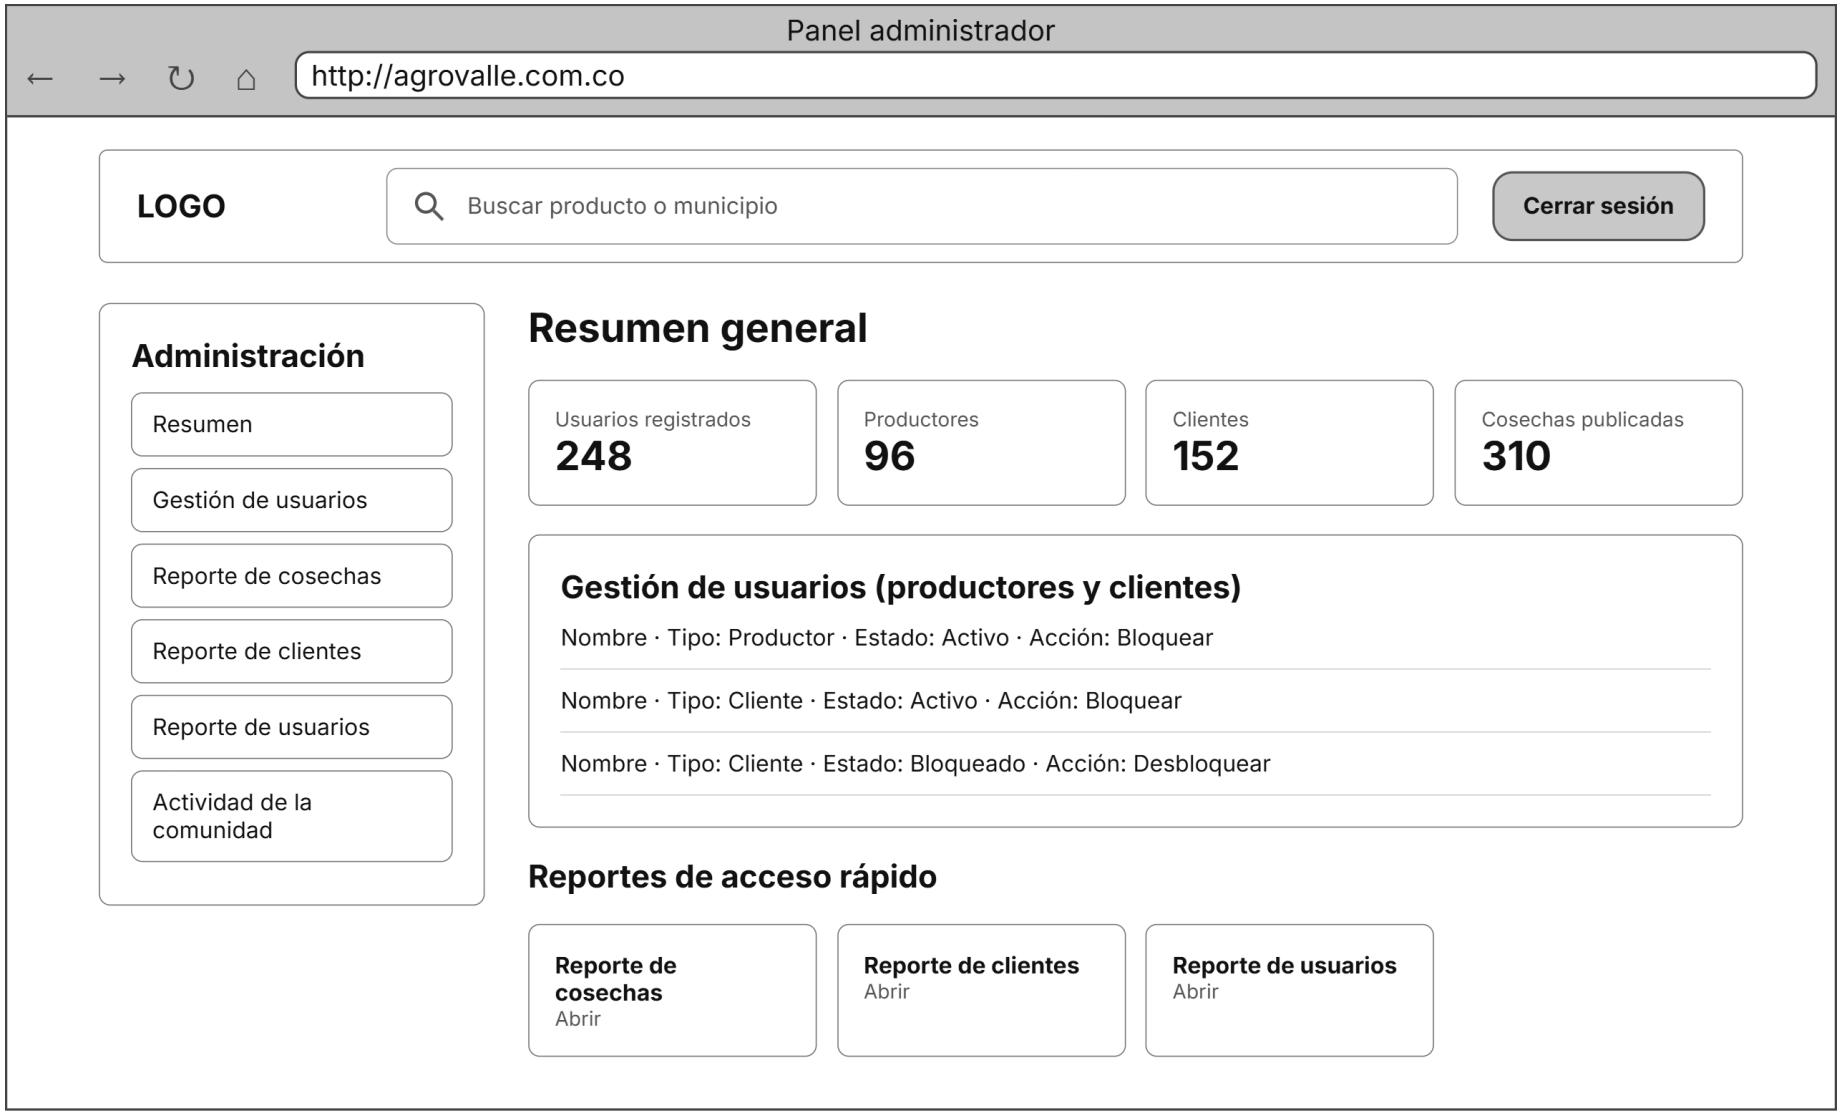

Mockup - Inicio

Lámina fuente recibida del equipo

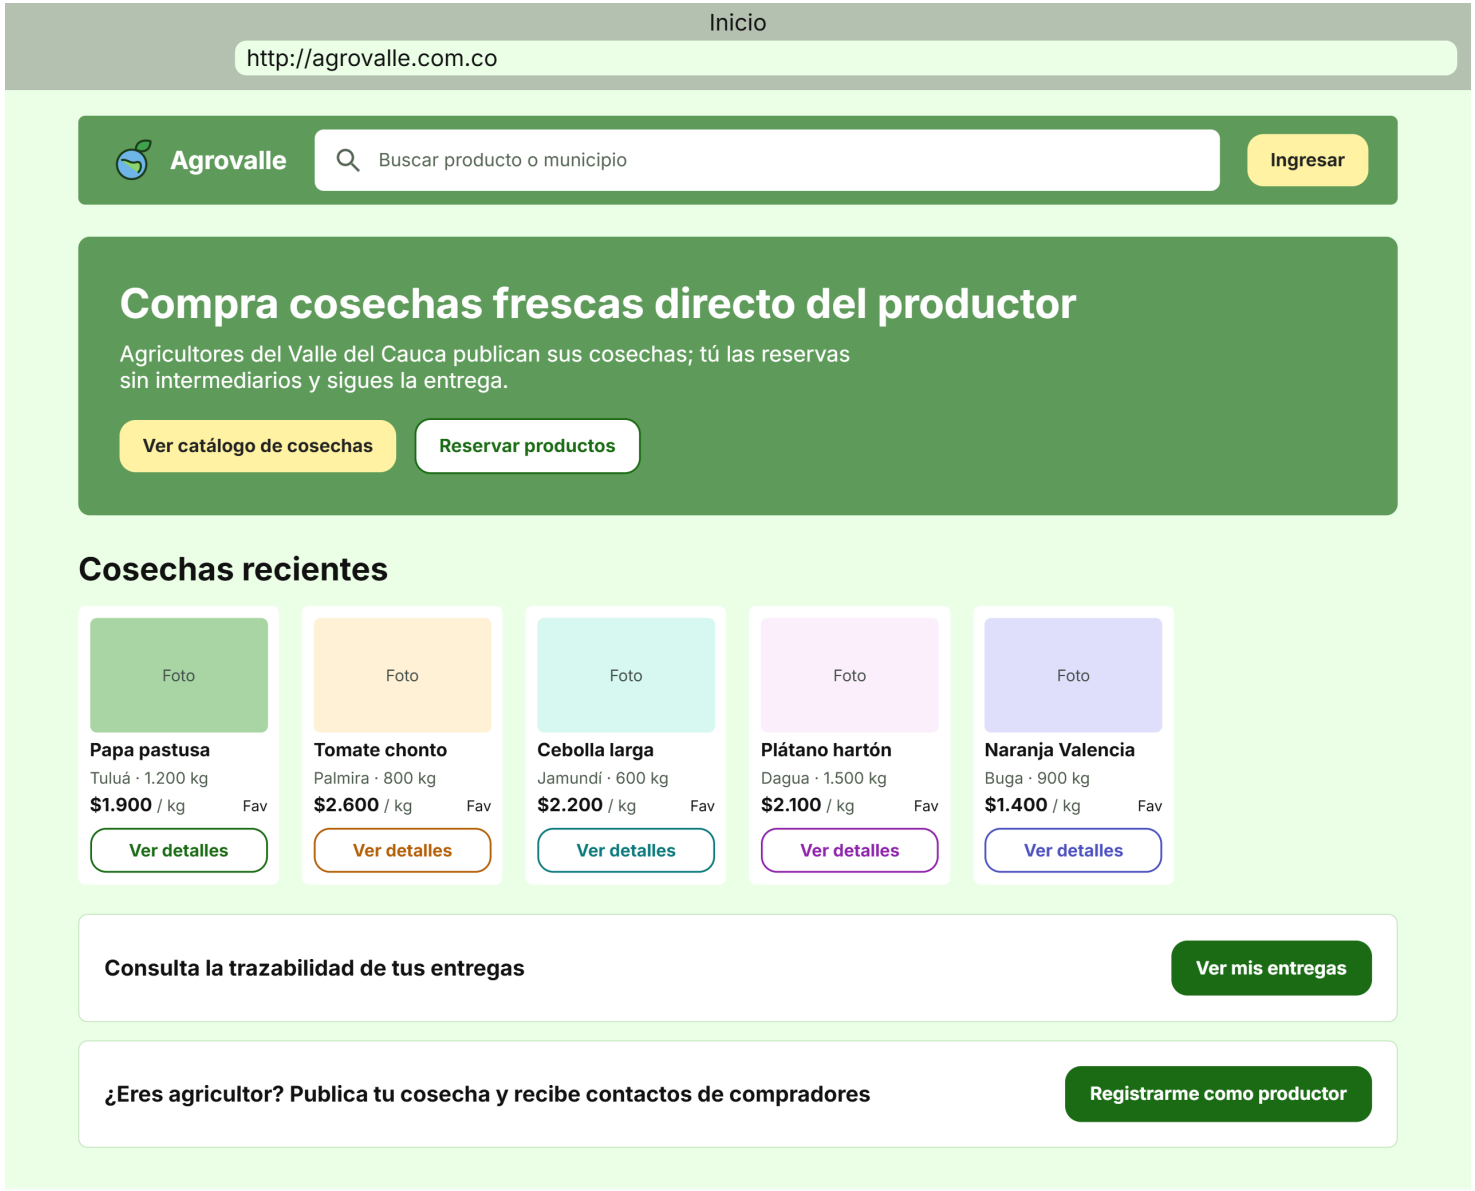

Mockup - Catálogo

Lámina fuente recibida del equipo

Catálogo

http://agrovalle.com.co

Agrovalle

Buscar producto o municipio

Ingresar

Filtros

Municipio

Todos los municipios

Productor o comerciante


Todos

Categoría

Todas las categorías

Aplicar filtros

Precio regional (ejemplo)



Historial de cambios

Cosechas recientes

Foto

Papa pastusa
Tuluá · 1.200 kg
$1.900 / kg Fav
Ver detalles

Foto

Tomate chonto
Palmira · 800 kg
$2.600 / kg Fav
Ver detalles

Foto

Cebolla larga
Jamundí · 600 kg
$2.200 / kg Fav
Ver detalles

Foto

Plátano hartón
Dagua · 1.500 kg
$2.100 / kg Fav
Ver detalles

Foto

Naranja Valencia
Buga · 900 kg
$1.400 / kg Fav
Ver detalles

Foto

Aguacate Hass
Sevilla · 450 kg
$6.800 / kg Fav
Ver detalles

Foto

Zanahoria
Tuluá · 950 kg
$1.500 / kg Fav
Ver detalles

Foto

Mora de Castilla
Dagua · 300 kg
$5.200 / kg Fav
Ver detalles

Foto

Limón Tahití
Jamundí · 700 kg
$1.800 / kg Fav
Ver detalles

Foto

Lulo
Sevilla · 250 kg
$4.900 / kg Fav
Ver detalles


Mockup - Detalles

Lámina fuente recibida del equipo




Mockup - Registro

Lámina fuente recibida del equipo

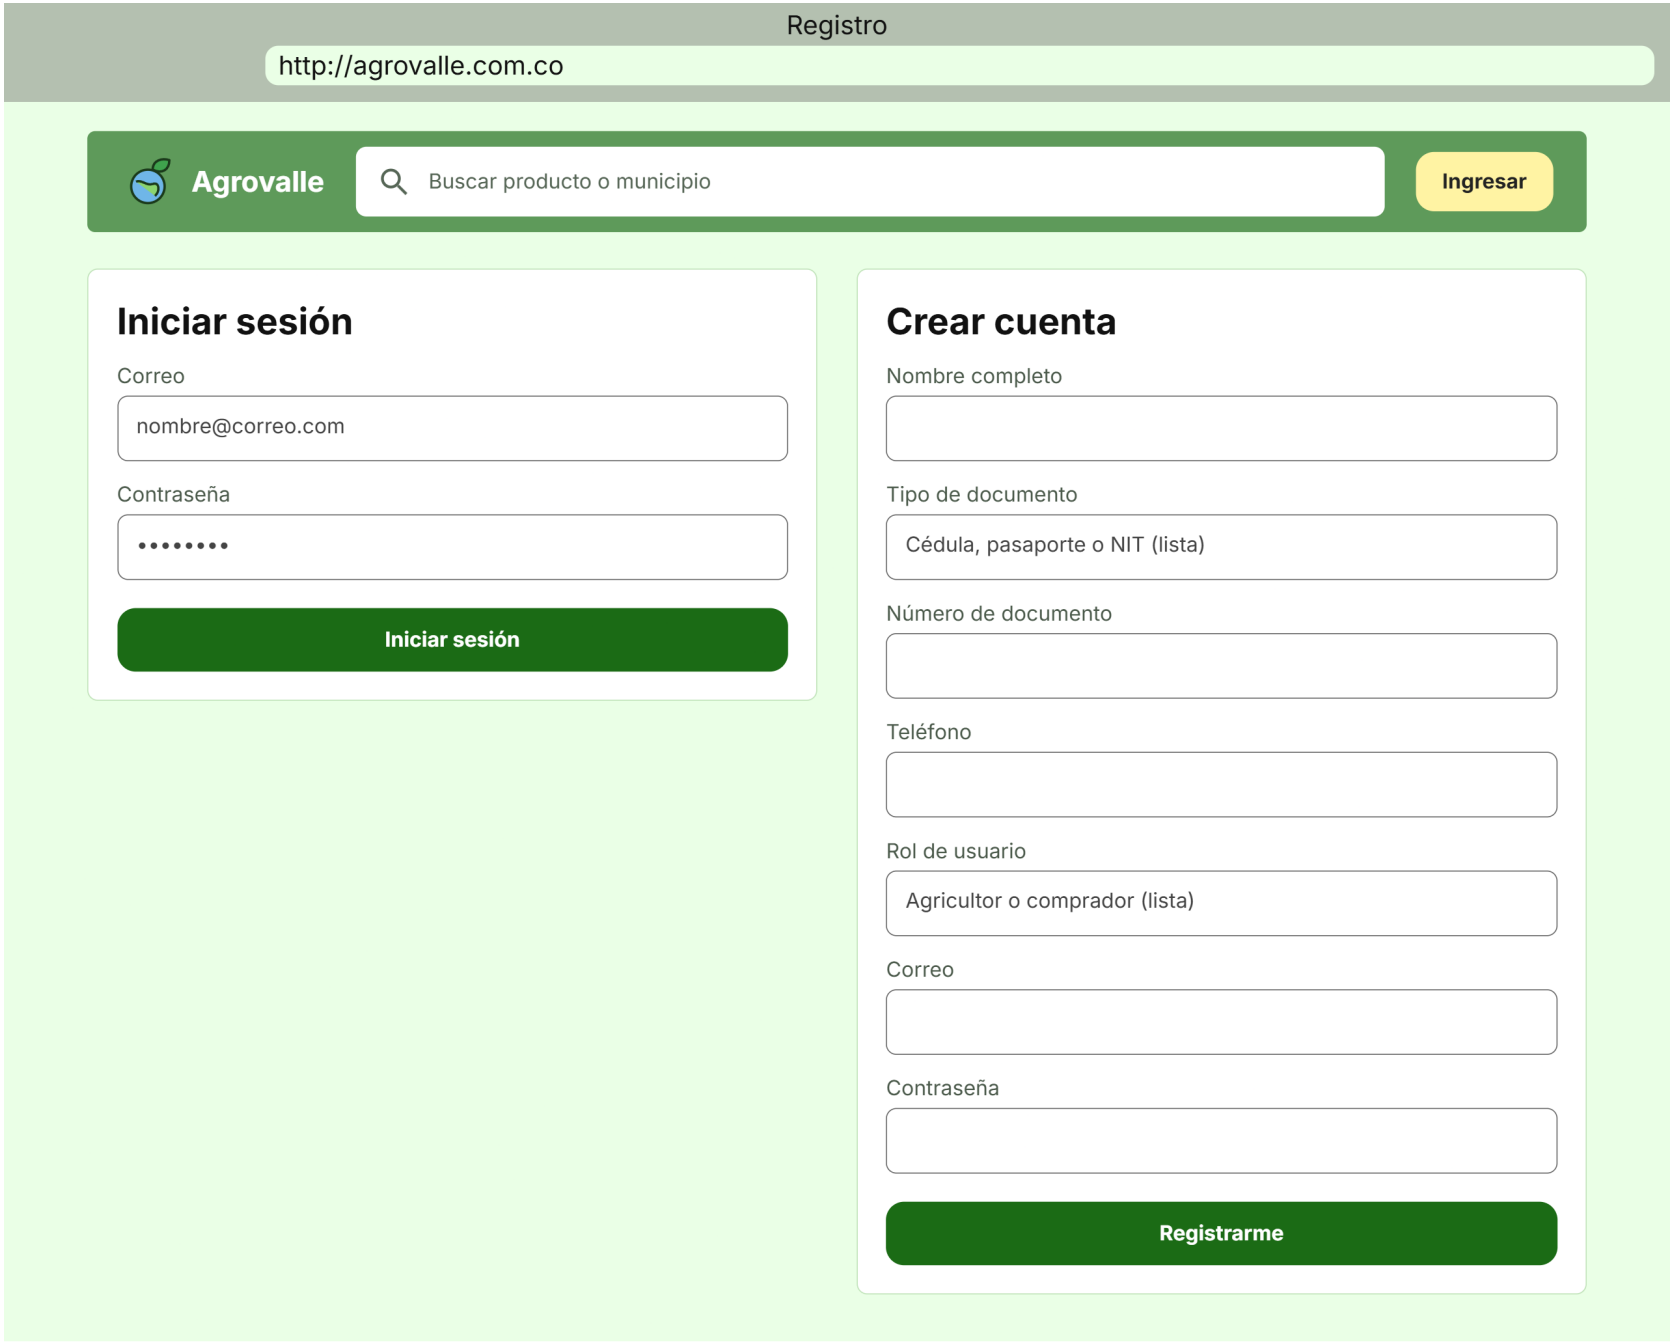


Mockup - Publicar

Lámina fuente recibida del equipo

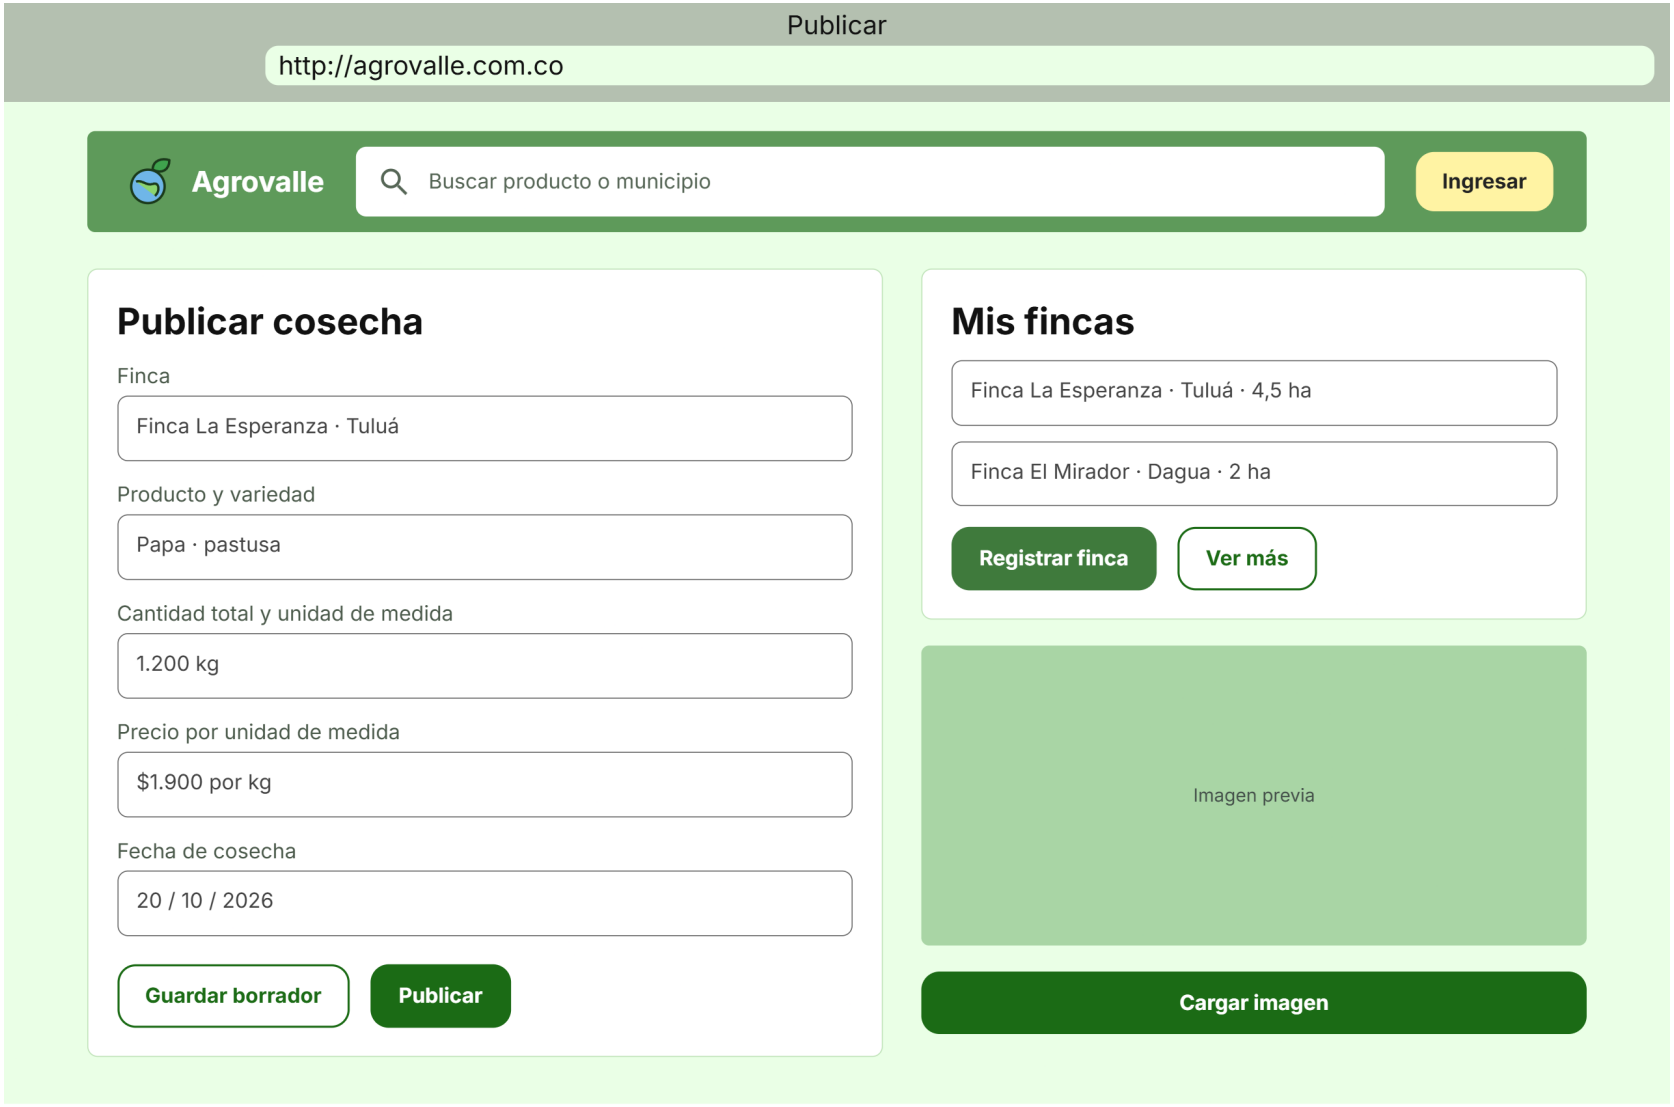

Mockup - Panel agricultor

Lámina fuente recibida del equipo

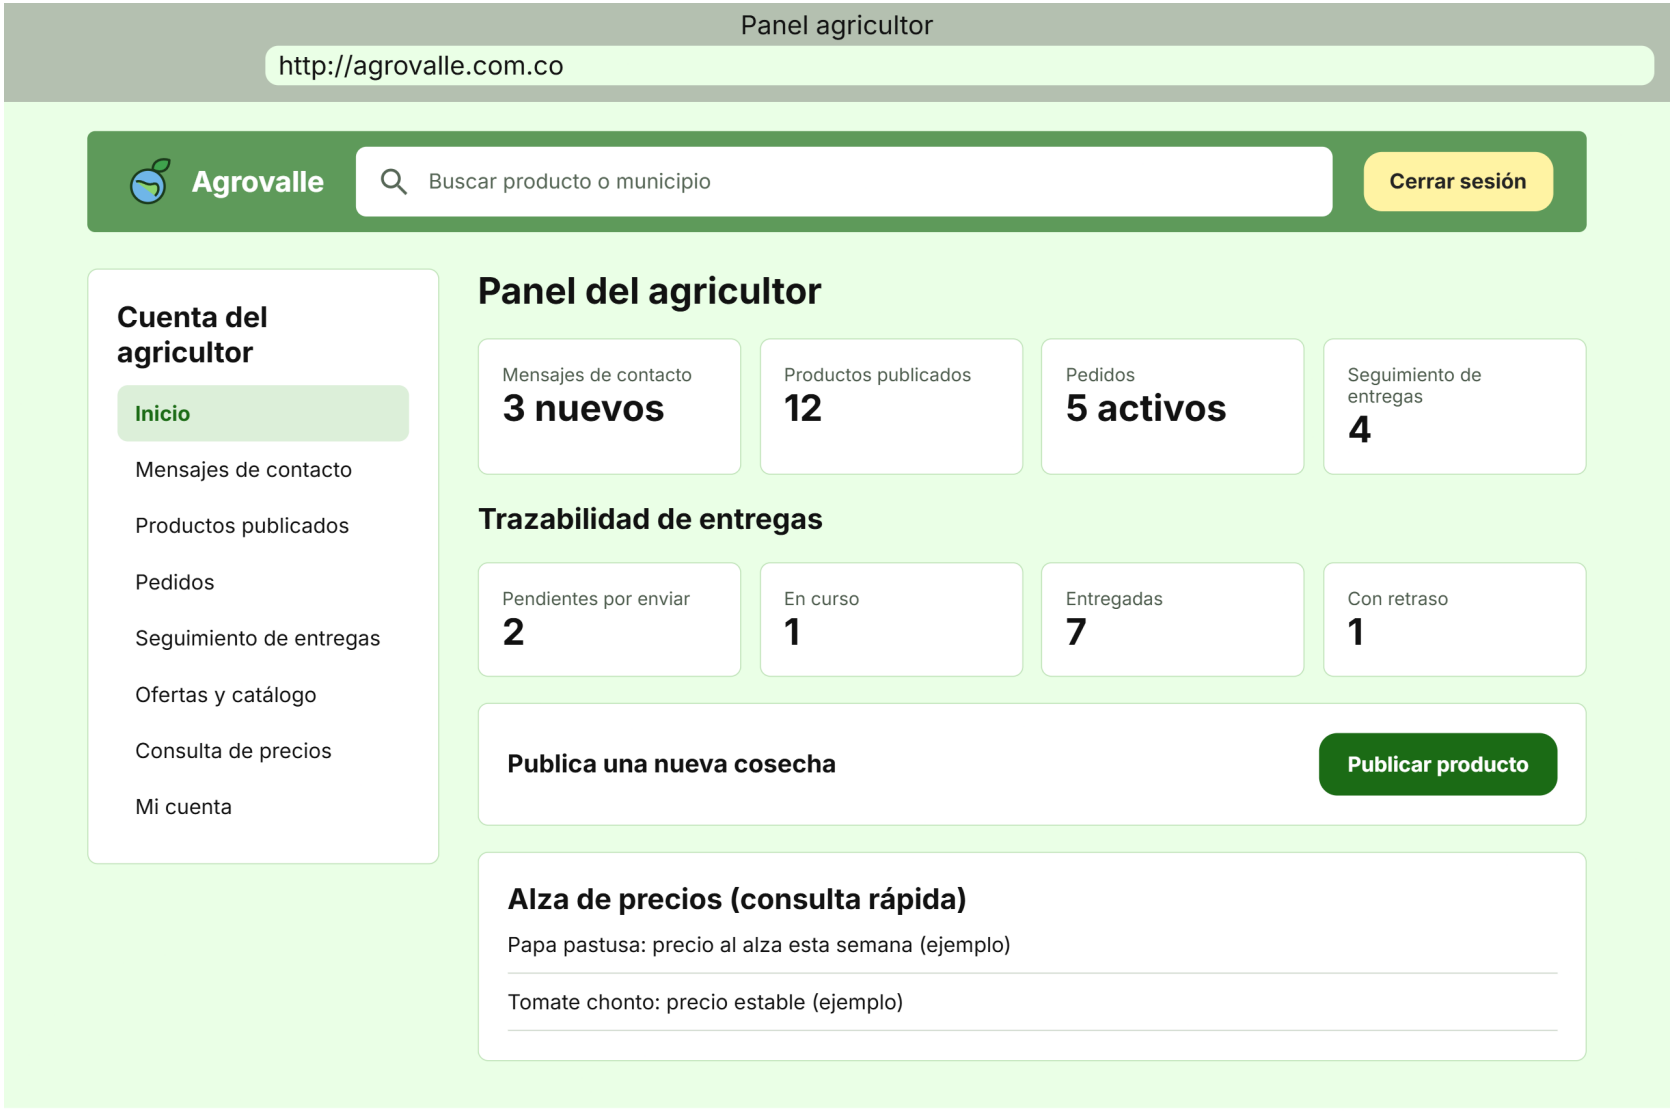


Mockup - Panel administrador

Lámina fuente recibida del equipo




Secuencia - Registro de agricultor

Lámina fuente recibida del equipo

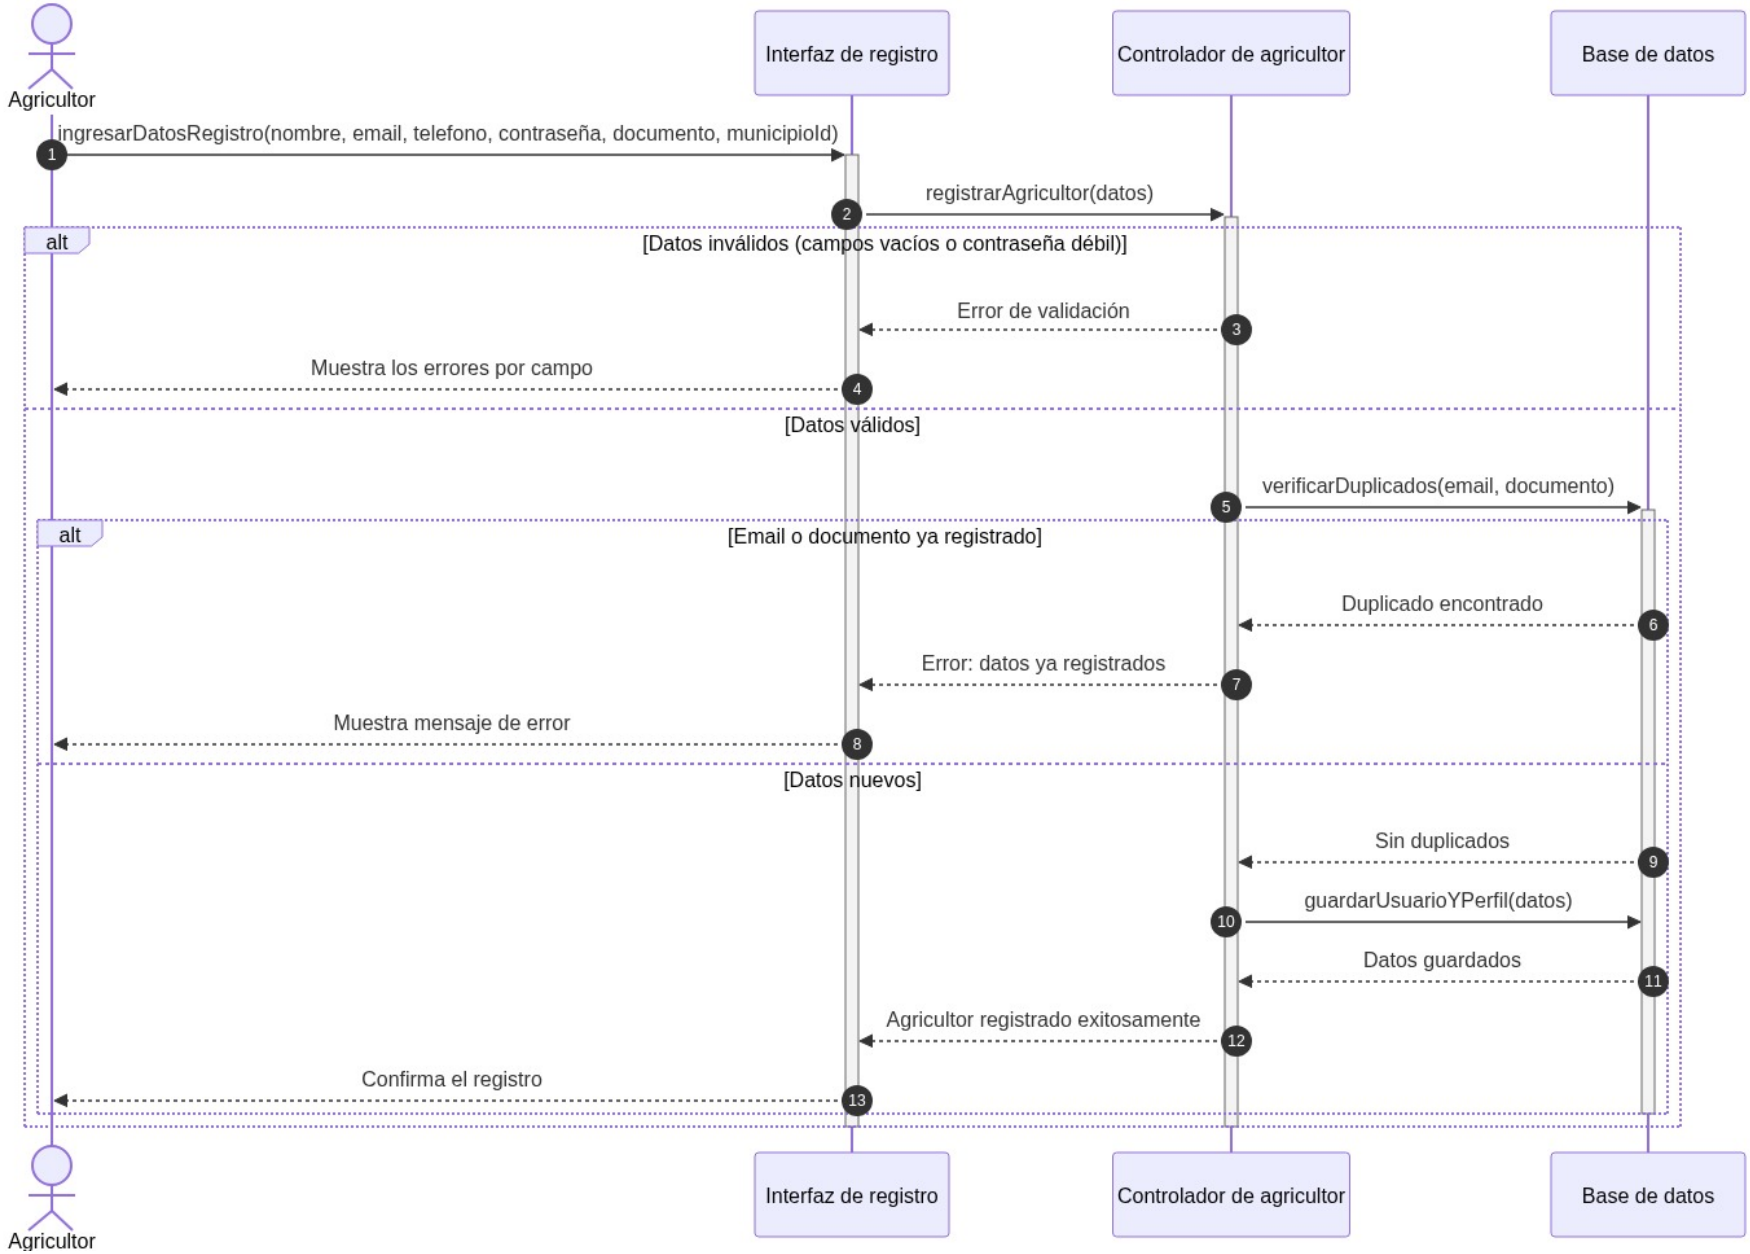


Secuencia - Inicio de sesión y publicación

Lámina fuente recibida del equipo

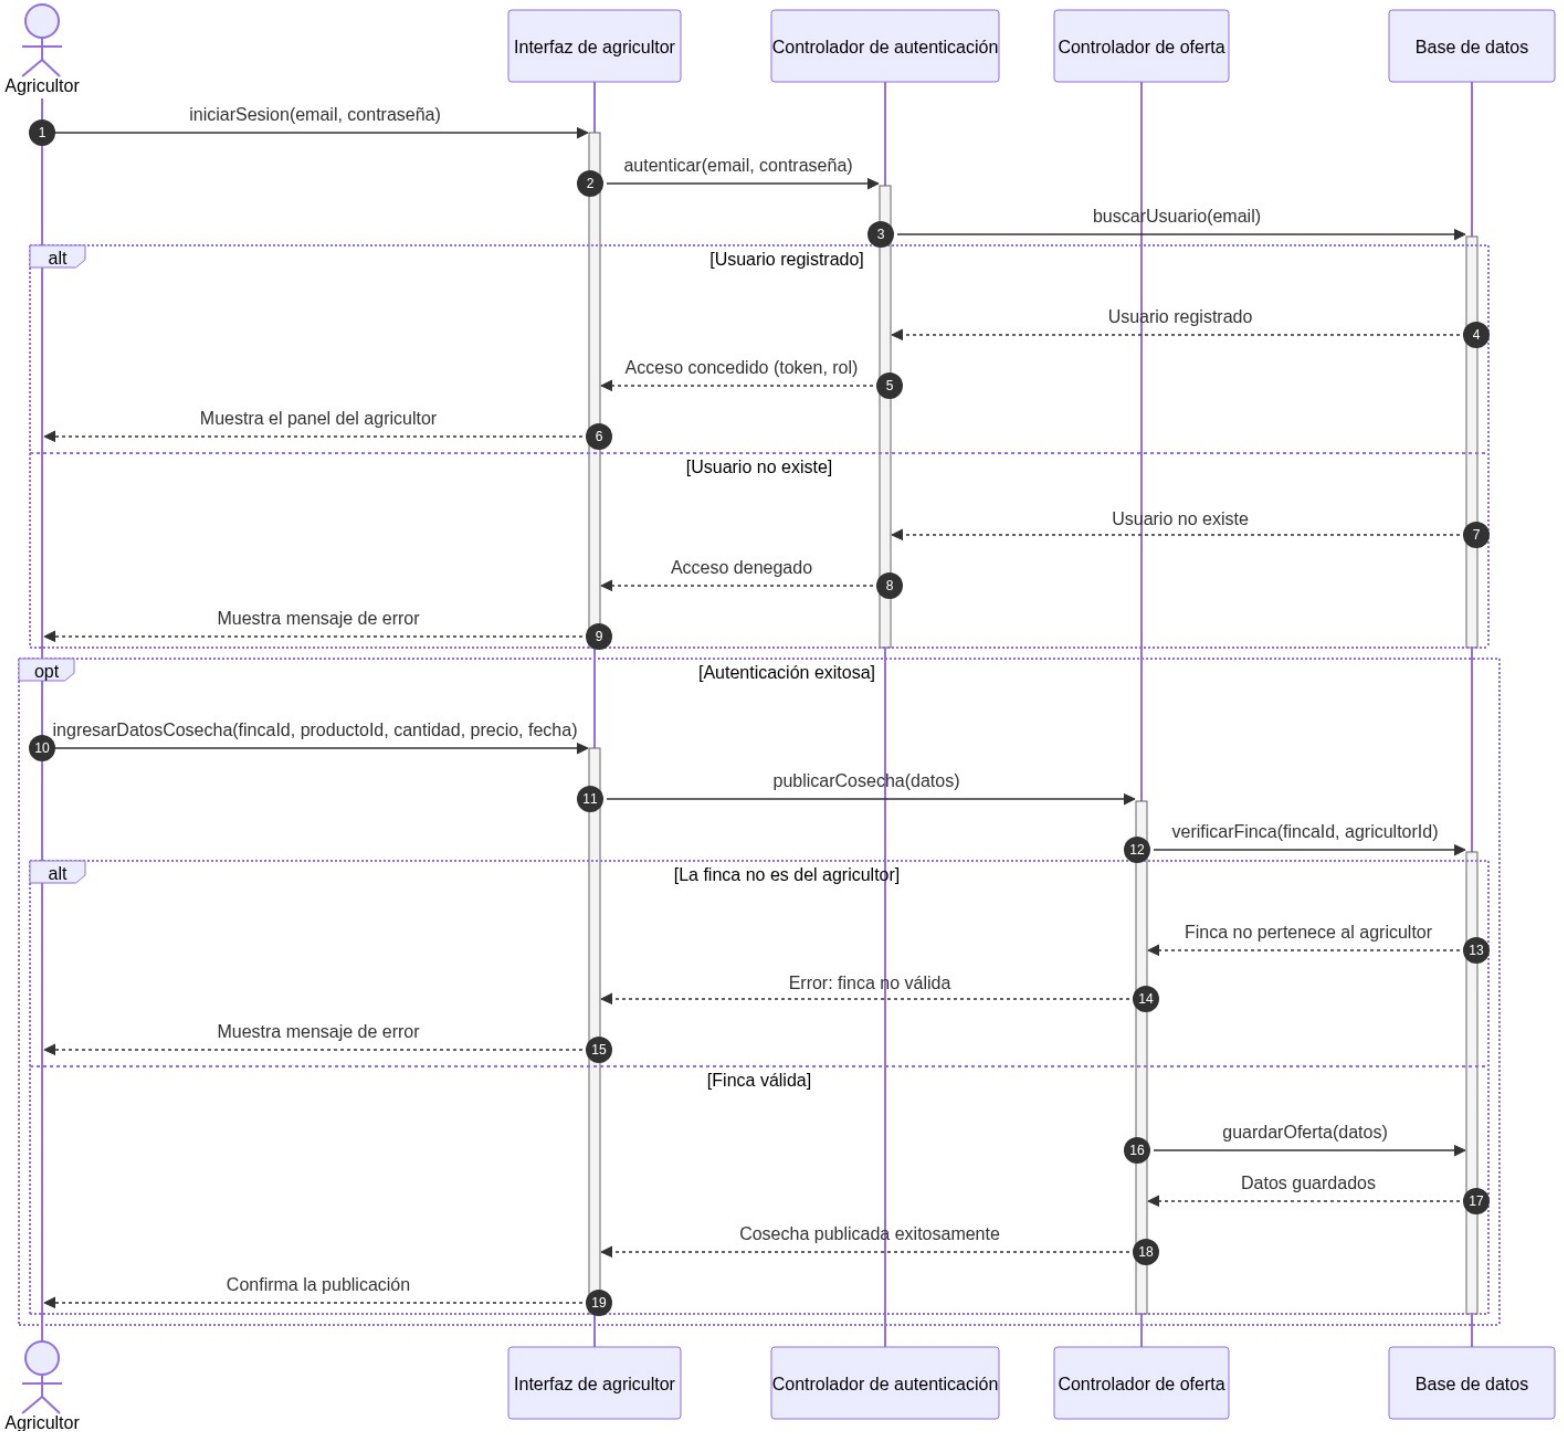


Secuencia - Reserva de comprador

Lámina fuente recibida del equipo

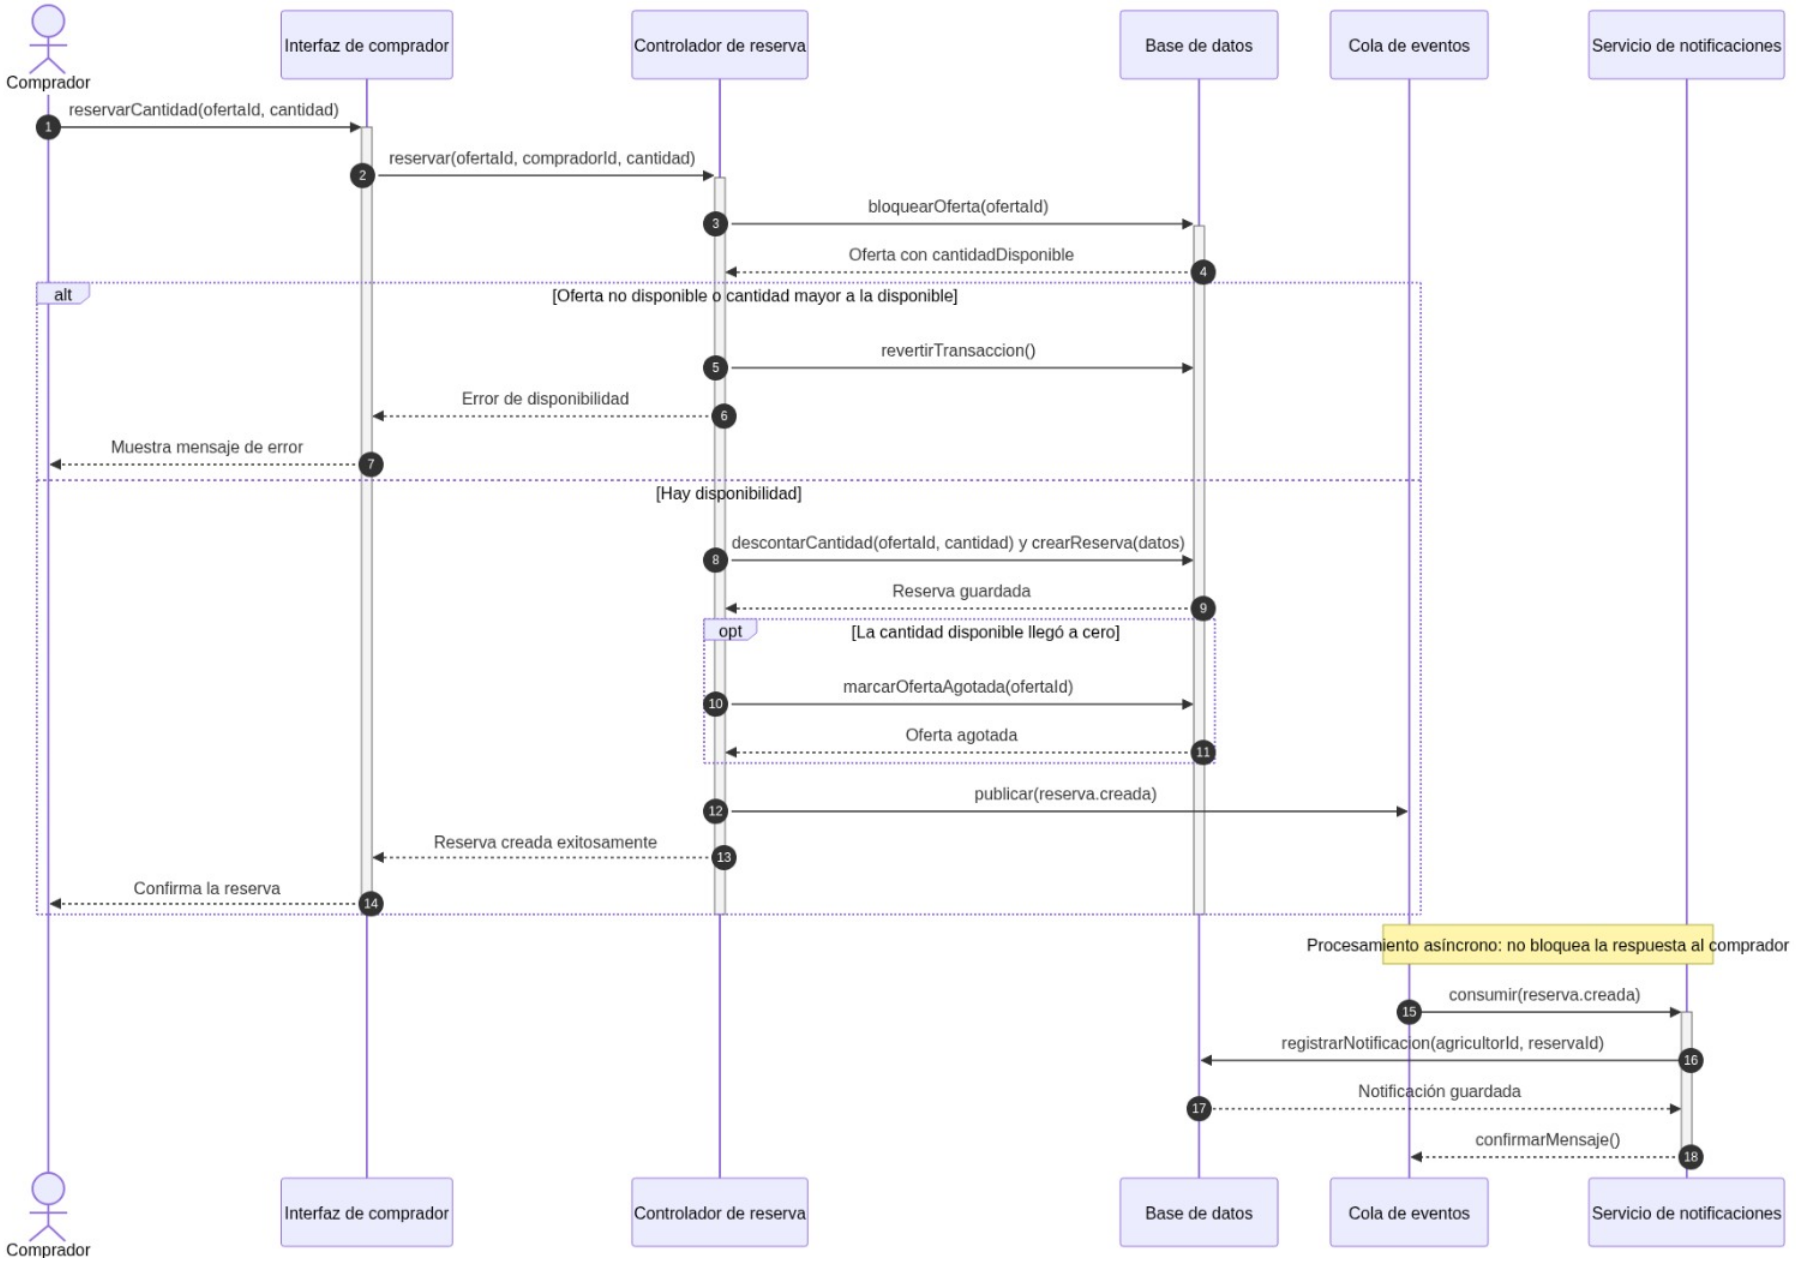


Secuencia - Contacto al agricultor

Lámina fuente recibida del equipo

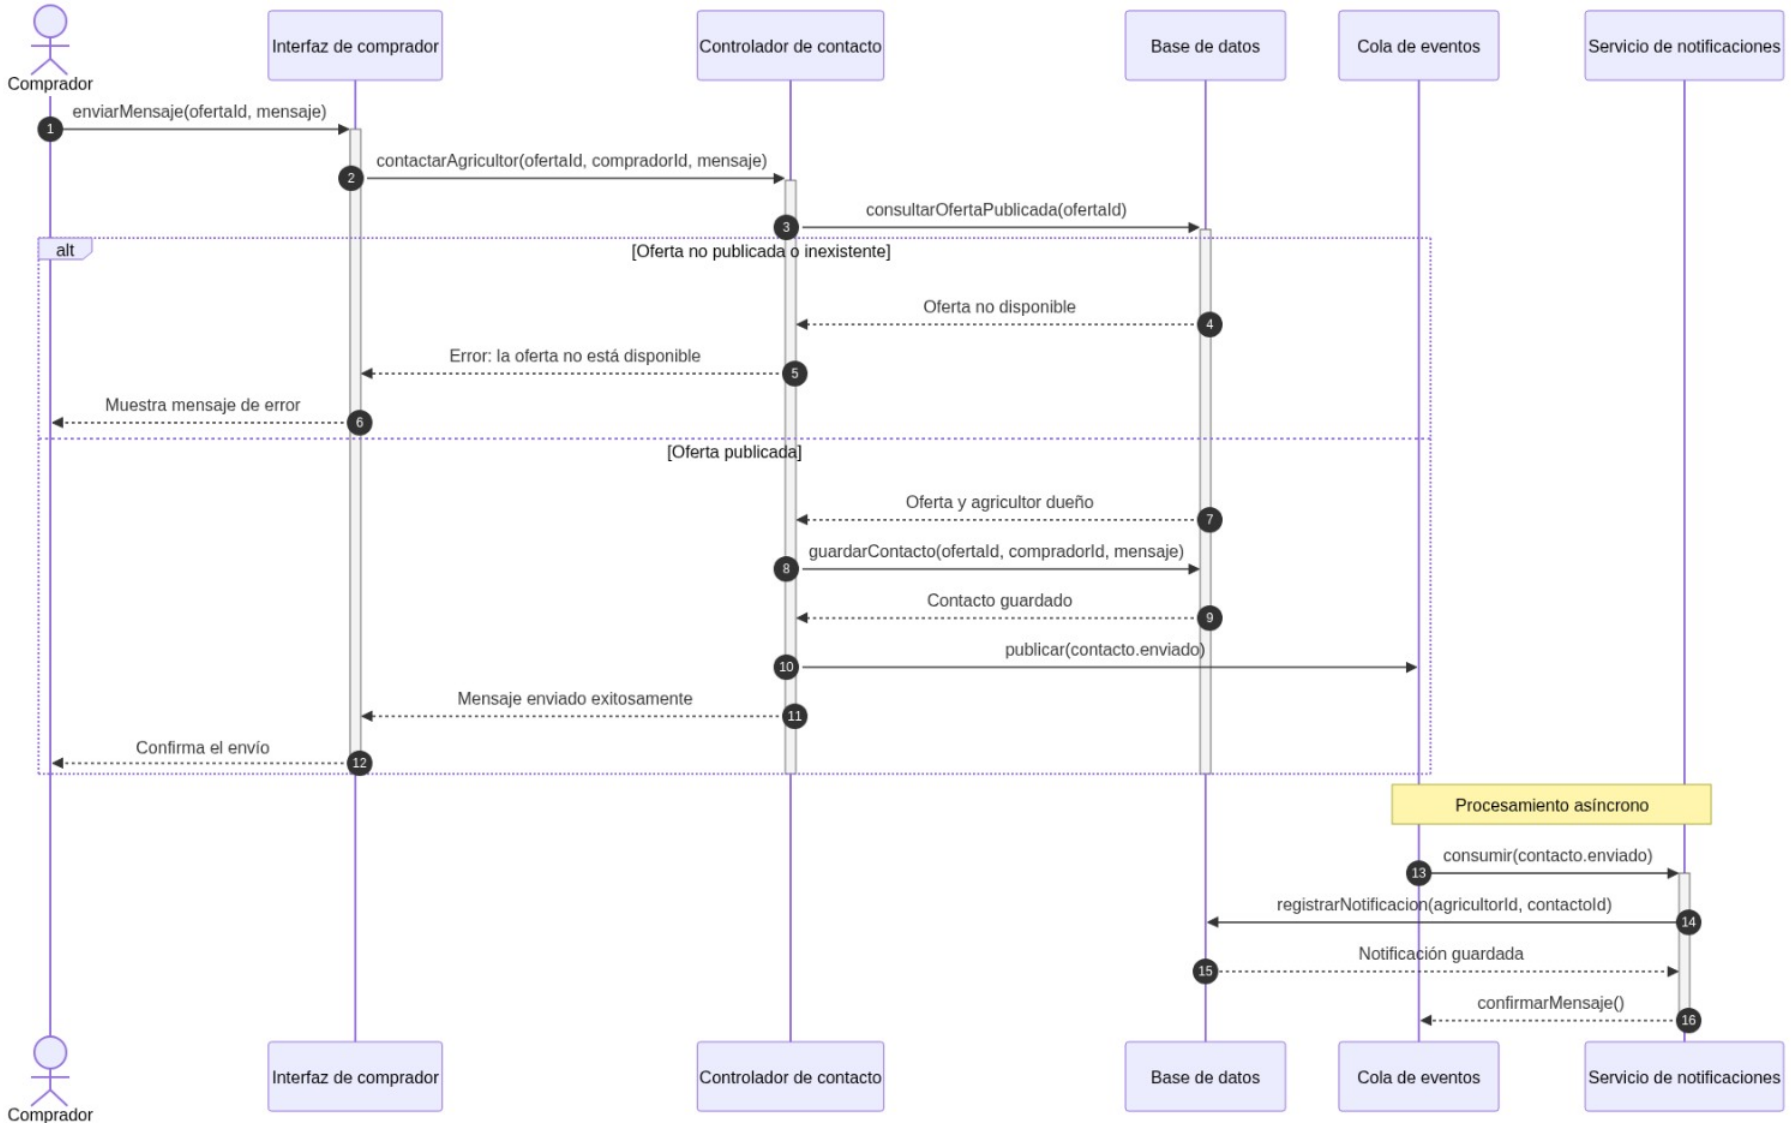


Secuencia - Programación de despacho

Lámina fuente recibida del equipo

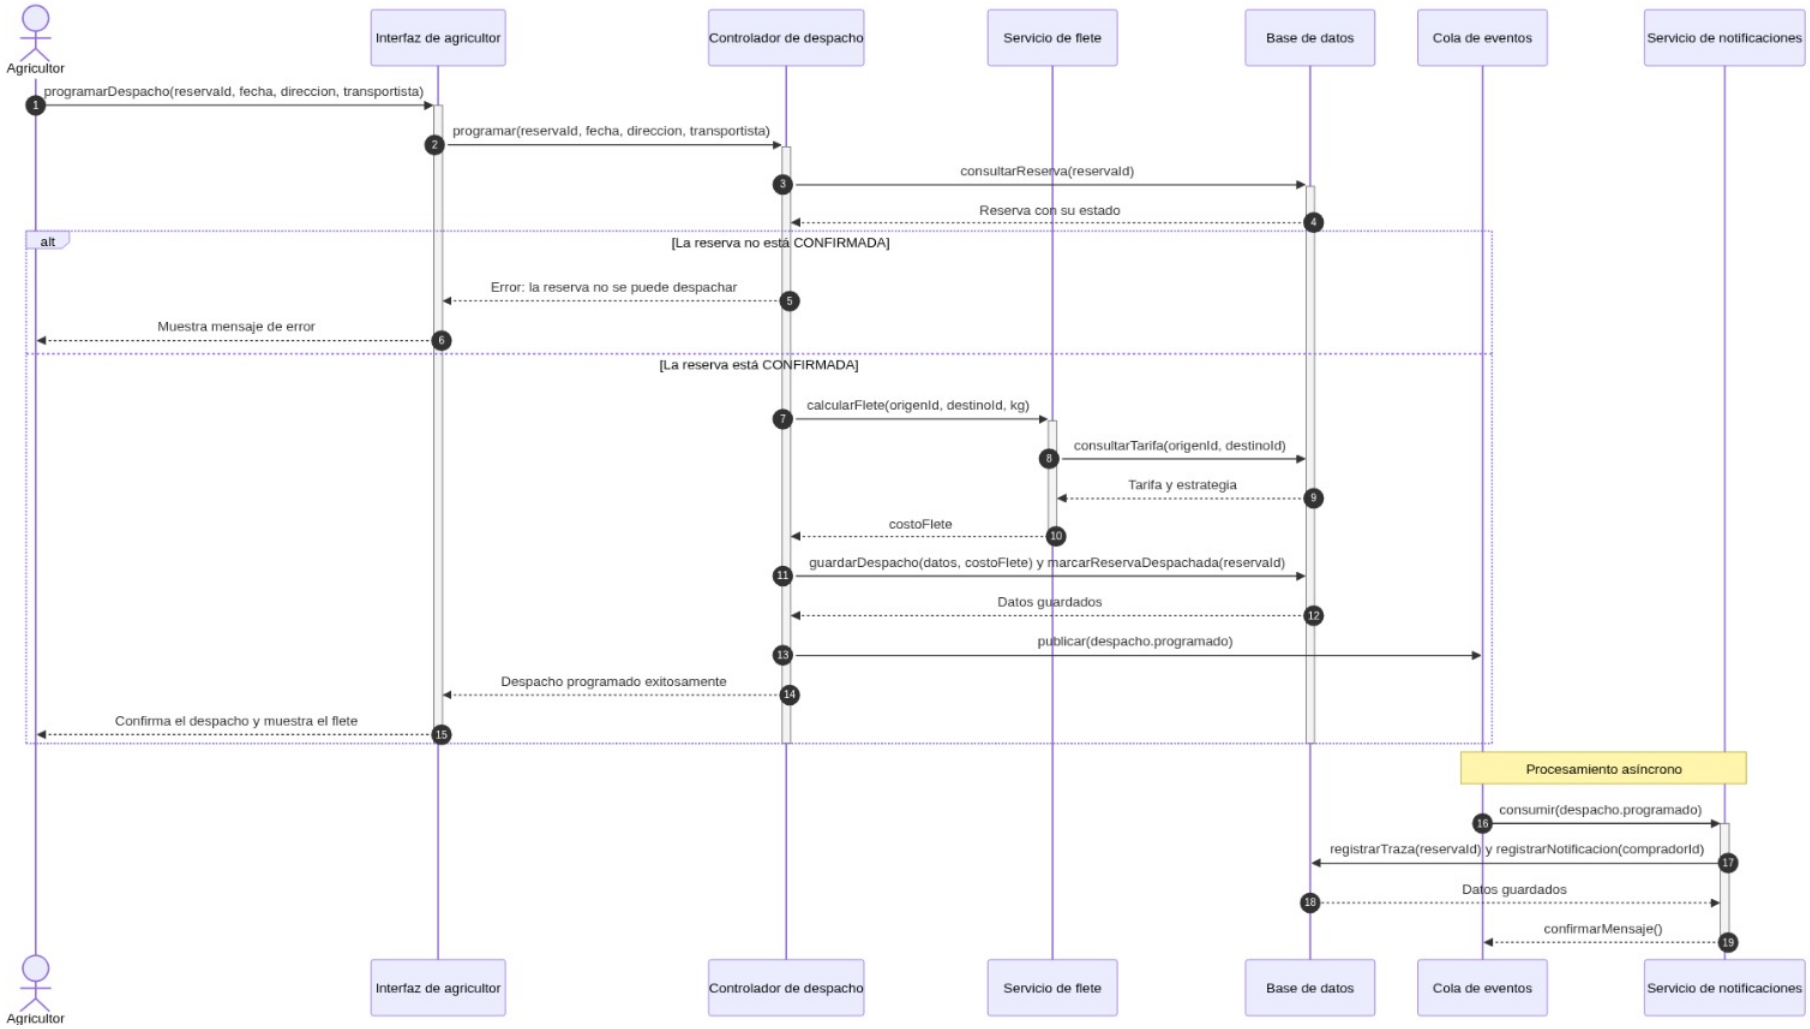


Secuencia - Registro de producto (referencia anterior)

Lámina fuente recibida del equipo

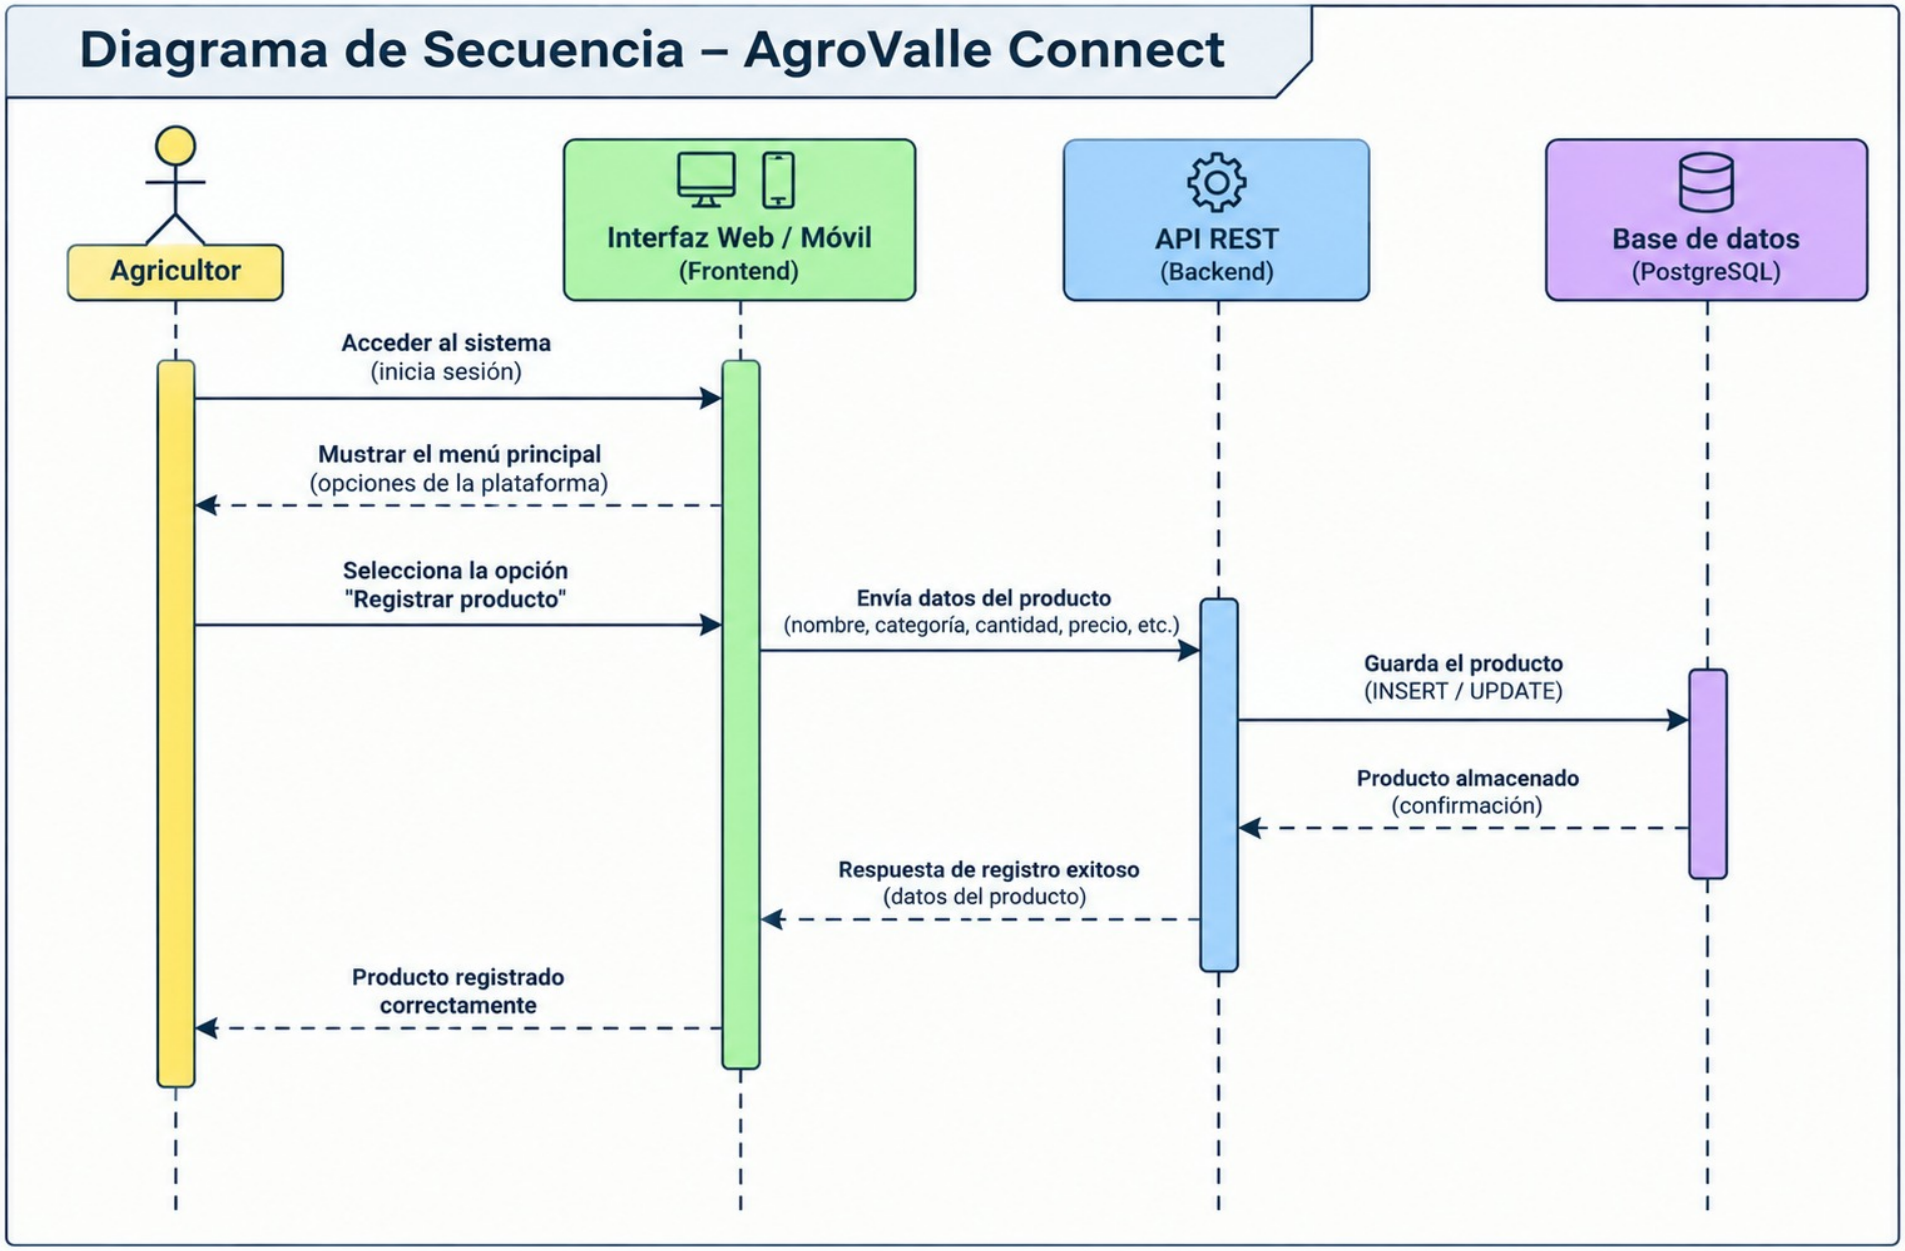

Evidencia de Integración Continua


GitHub Actions #83 — estado **Success** — commit **6c19aae** en `main`. La ejecución incluye Build, tests, Checkstyle y JaCoCo, además de despliegue a staging. Abrir ejecución.

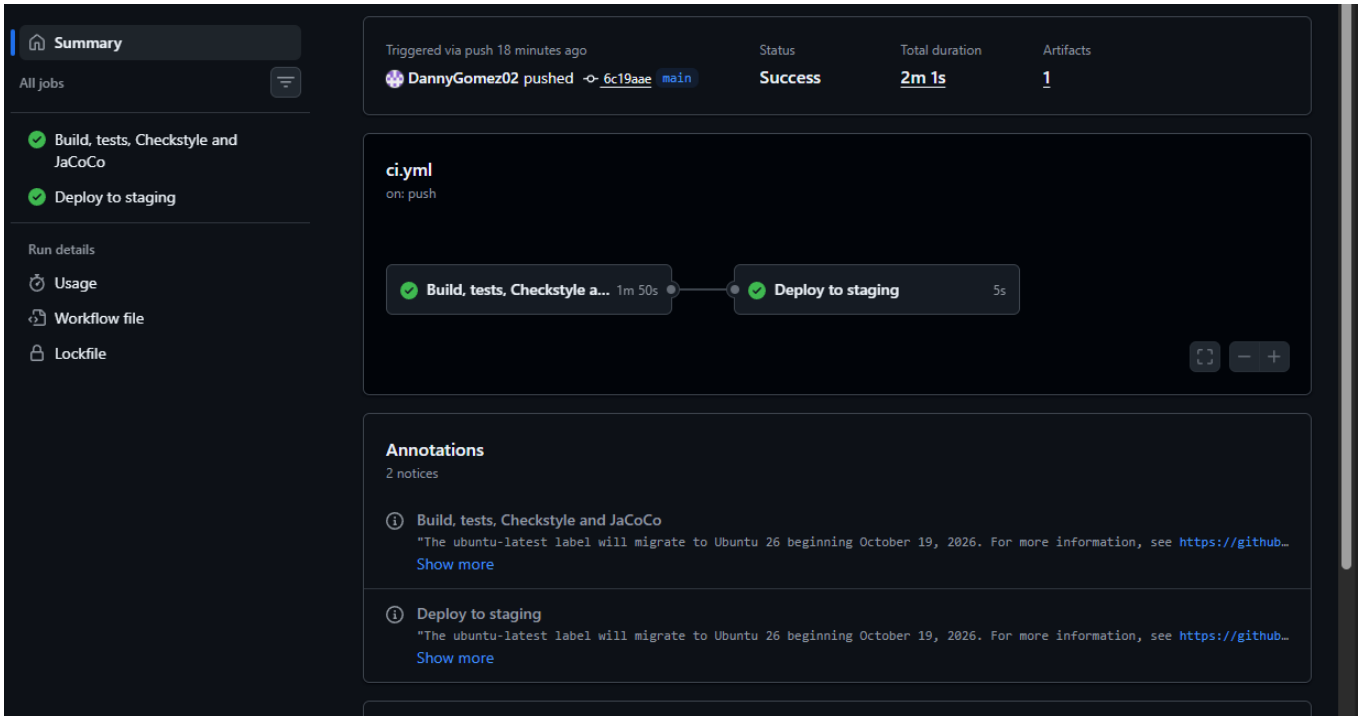

La captura prueba que ese workflow terminó en verde. El porcentaje de cobertura se demuestra en la página siguiente y pertenece al artefacto de esta misma ejecución.

Evidencia de cobertura JaCoCo

Reporte HTML descargado del artefacto de GitHub Actions #83 para el commit **6c19aae**. El artefacto original está en GitHub Actions.

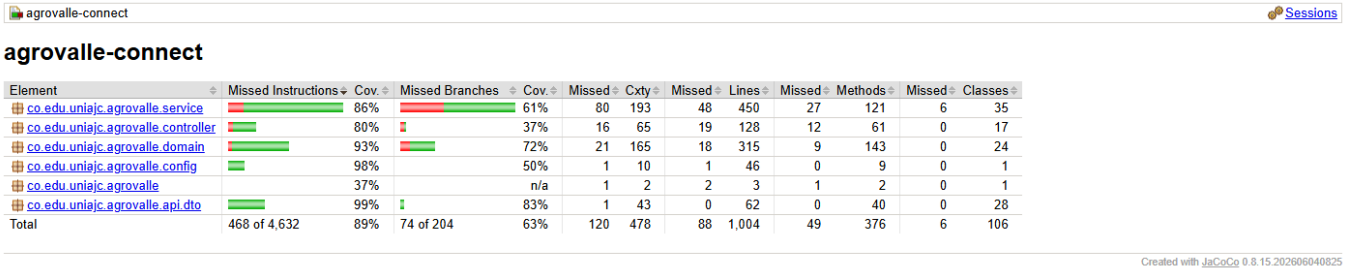

agrovalle-connect

Sessions

agrovalle-connect

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
co.edu.uniajc.agrovalle.service		86%		61%	80	193	48	450	27	121	6	35
co.edu.uniajc.agrovalle.controller		80%		37%	16	65	19	128	12	61	0	17
co.edu.uniajc.agrovalle.domain		93%		72%	21	165	18	315	9	143	0	24
co.edu.uniajc.agrovalle.config		98%		50%	1	10	1	46	0	9	0	1
co.edu.uniajc.agrovalle		37%		n/a	1	2	2	3	1	2	0	1
co.edu.uniajc.agrovalle.api.dto		99%		83%	1	43	0	62	0	40	0	28
Total	468 of 4,632	89%	74 of 204	63%	120	478	88	1,004	49	376	6	106

Created with JaCoCo 0.8.15.202606040825

Métrica	Resultado del HTML	Umbral del proyecto	Estado
Instrucciones	89%	≥ 60%	Cumple
Ramas	63%	≥ 60%	Cumple
Líneas	91%	≥ 60%	Cumple

Las cifras cumplen los umbrales configurados para el commit de `main` indicado. El código y las pruebas locales coinciden con ese commit; la cobertura no incluye los documentos ni exports que siguen locales.
